


COPA 2014 AEROPORTOS


AEROPORTOS DA COPA

- 13 Aeroportos
- 31 Intervenções
- R\$ 5,79 bilhões

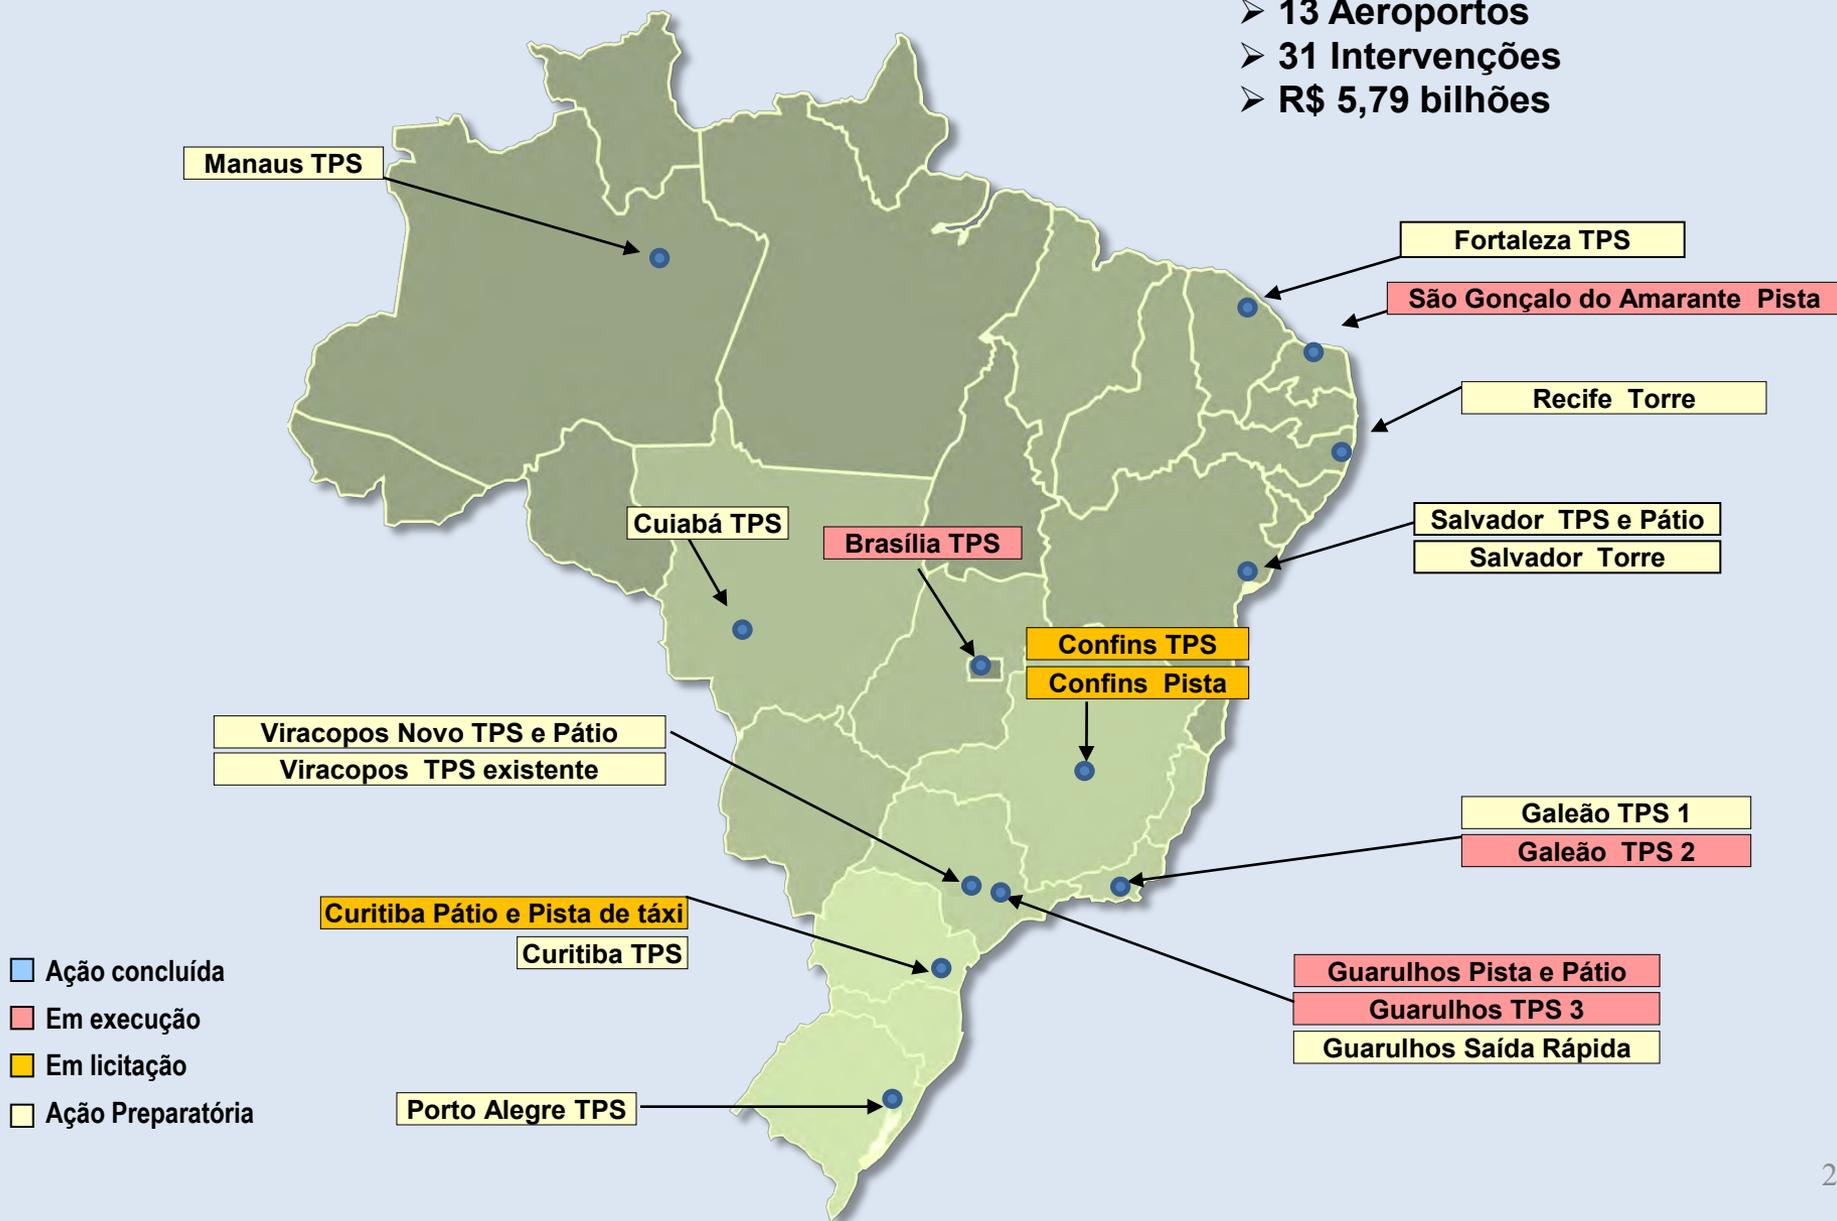


GUARULHOS

GUARULHOS

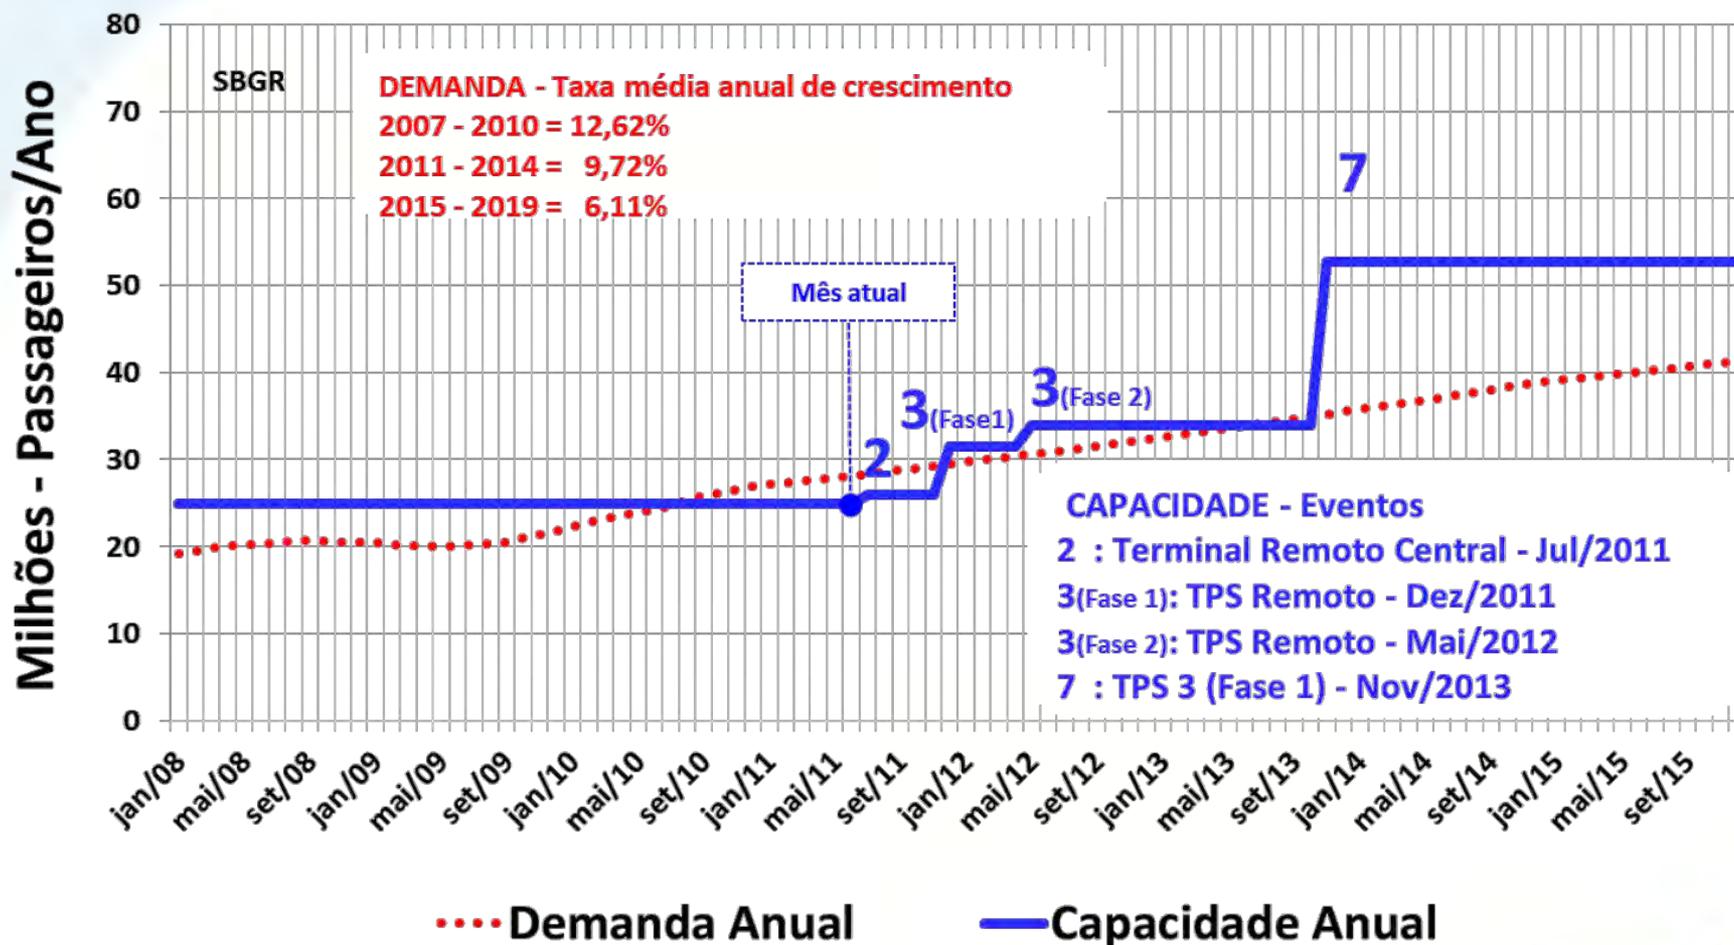

Guarulhos

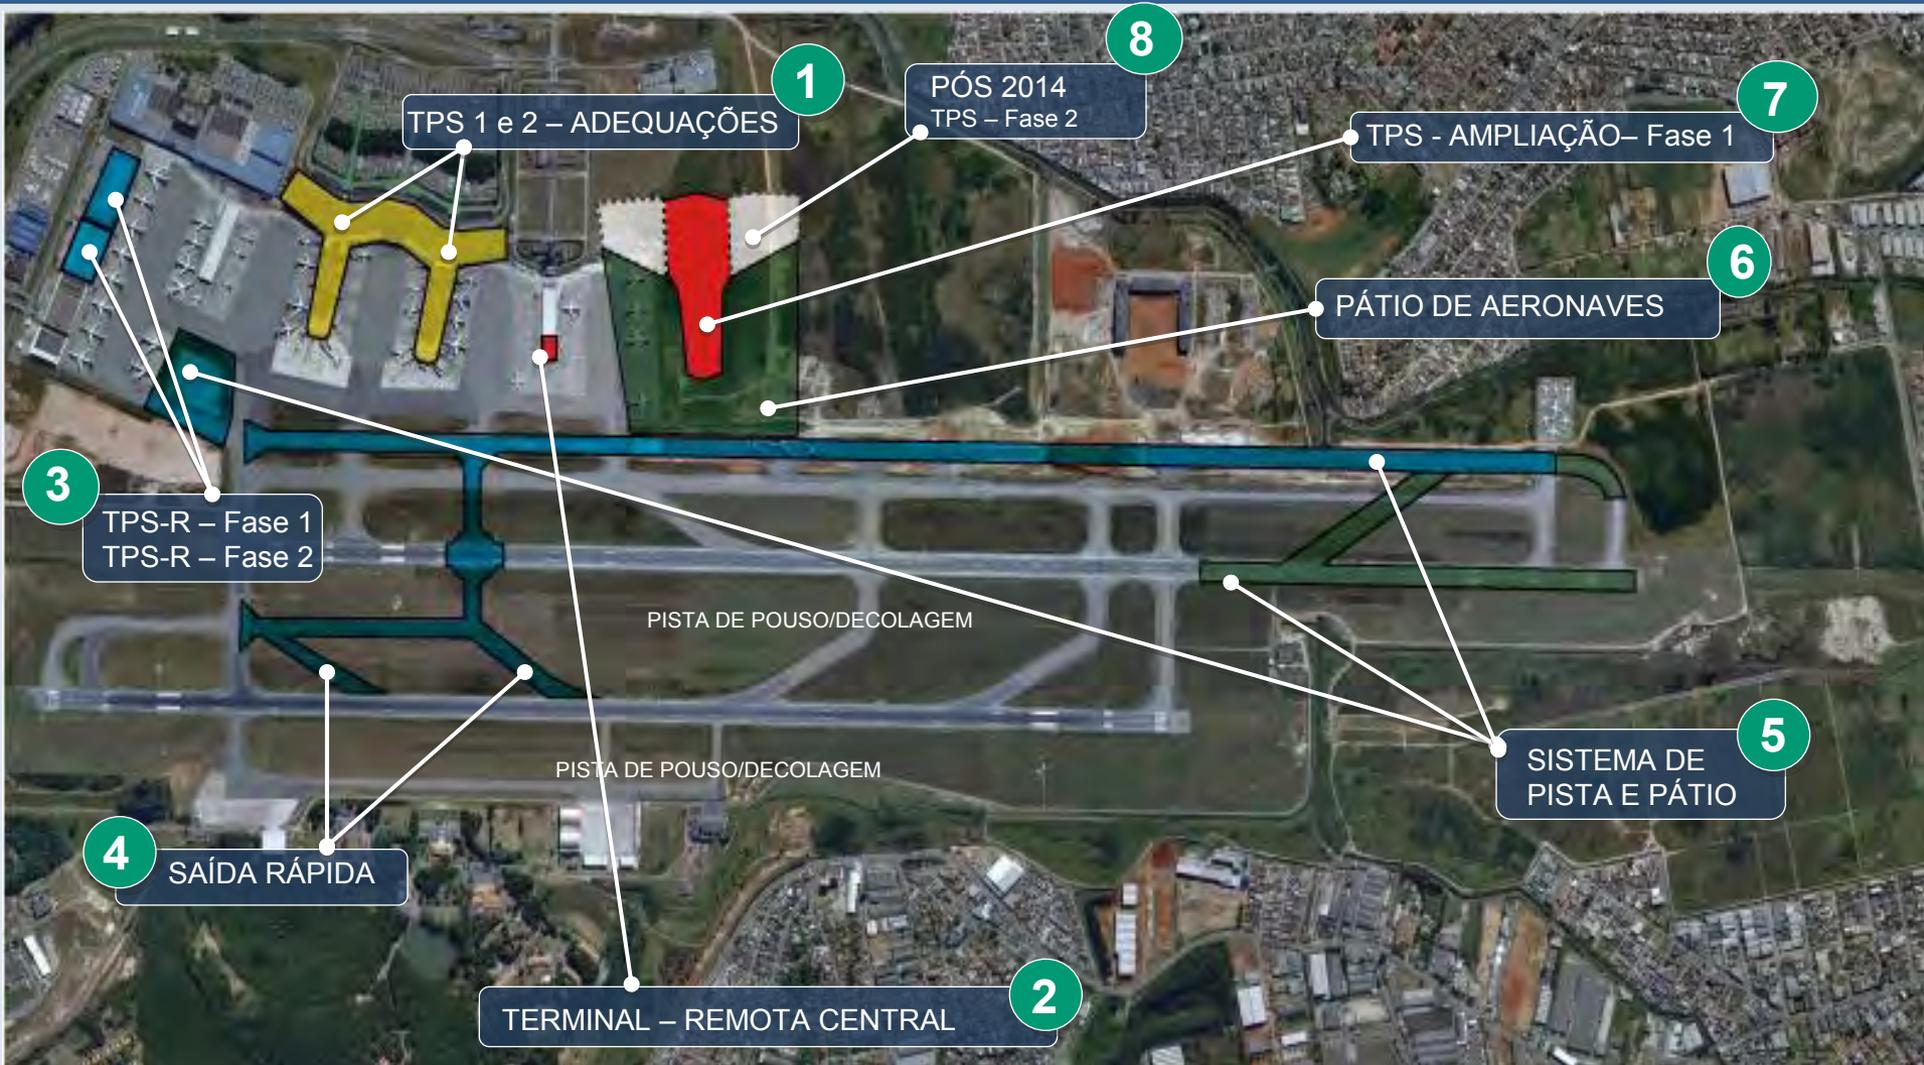

Valor Total Previsto dos Investimentos: 1,3 bilhão

Guarulhos

1 TPS 1

Embarque Internacional

Ampliação em 700m² da área de inspeção de passageiros e emigração

Acréscimo de 6 para 7 aparelhos de raio-x

Polícia Federal:

Aumento de 14 para 20 posições

Redução prevista de 35% do tempo de processamento de embarque (em medição)

Obra: concluída em 31/05/2011

Embarque Doméstico

Ampliação de 120m²

Acréscimo de 4 para 7 aparelhos de raio-x

Redução prevista em 35% do tempo de processamento de embarque (em medição)

Obra: concluída em 31/05/2011

Desembarque Internacional

Ampliação de 240m²

Polícia Federal:

Aumento de 18 para 32 posições

Redução de 35% do tempo de processamento

Obra: em execução

Fim: 15/dez/2011

Receita Federal:

Aumento de 1 para 2 canais seletores

Obra: concluída em 17/dez/2010

Redução de 50% do tempo de processamento

TPS 2

1

Embarque Internacional

Ampliação em 670m² da área de inspeção de passageiros e emigração

Polícia Federal:

Aumento de 12 para 20 posições

Redução prevista de 35% do tempo de processamento de embarque (em medição)

Obra: em execução

Fim: 30/set/2011 (dependente de cassação de liminar)

Embarque Doméstico

Ampliação de 180m²

Acréscimo de 4 para 6 aparelhos de raio-x

Redução prevista em 35% do tempo de processamento de embarque (em medição)

Obra: concluída em 31/05/2011

Desembarque Internacional

Ampliação de 165m² da área de inspeção de passageiros

Polícia Federal:

Aumento de 20 para 36 posições

Redução de 50% do tempo de processamento

Obra: em execução

Fim : 15/dez/2011

Receita Federal:

Ampliação de 1 para 2 canais

Obra: Concluída e serviço implantado

2 Terminal - Remota Central

Área :1.200 m² Capacidade: 1 milhão de pax/ano
Em obras
Fim: 30/jul/2011

3 Terminal Remoto

Adequação das vias de acesso e estacionamento de veículos

Terminal Remoto (Fase 1) - Área: 19.000m² - Capacidade: 5,5 milhões pax/ano

Terminal Remoto (Fase 2) - Área: 8.000m² - Capacidade: 2,5 milhões pax/ano

Terminal Remoto (Fase 1) - Contratação emergencial

Projeto básico e orçamento: concluído em 30/mai/2011

Início da obra: 20/jun/2011

Conclusão da Obra: 16/dez/2011

Terminal Remoto (Fase 2)

Publicação do edital da licitação: 15/jul/2011

Obra - início: 15/dez/2011 - conclusão: 20/mai/2012

Guarulhos

4 Pistas de Saídas Rápidas

Construção de 1 pista de saída rápida

Licença ambiental: concluída

Projeto básico e orçamento: concluídos em 10/mai/2011

Obra: edital publicado em 30/mai/2011

Início: 17/out/2011 - Fim: 07/dez/2012

5 Pátio

Ampliação do pátio de aeronaves

Obra: publicar o edital: 30/set/2011
(fim da perícia judicial)

Início: 30/jan/2012

Fim: 30/out/2013

5 Pistas

Construção de 1 pista de táxi

Ampliação de 2 pistas de taxi

Obras iniciadas em 06/mai/2010 pelo Exército

Fim: 11/dez/2011

6 Pátio do TPS 3

Terraplenagem:

Exército contratado

Iniciado em 18/mai/2011 - fim: 29/set/2012

Pavimentação:

Projeto básico: em execução - fim : 16/dez/2011

Publicar edital: 15/fev/2012

Início: 15/jul/2012 - fim: 15/set/2013

7 TPS 3 - (Fase 1)

Área : 92.000m² - Capacidade: 19 milhões pax/ano (até 2014)

Estudo preliminar: concluído

Licença ambiental: concluída

Projeto básico: em execução - fim: 16/dez/2011

Obra: início 06/ago/2012 - fim: 29/nov/2013

Concessão


* As fases licitar, iniciar e finalizar da obra poderão ser antecipadas em função do projeto de concessão ora em análise.

8 TPS 3 Pós 2014 (Fase 2)

Área: 138.000m² - Capacidade: 23 milhões pax/ano

Total: 230.000m² - Capacidade total: 42 milhões pax/ano

BRASÍLIA

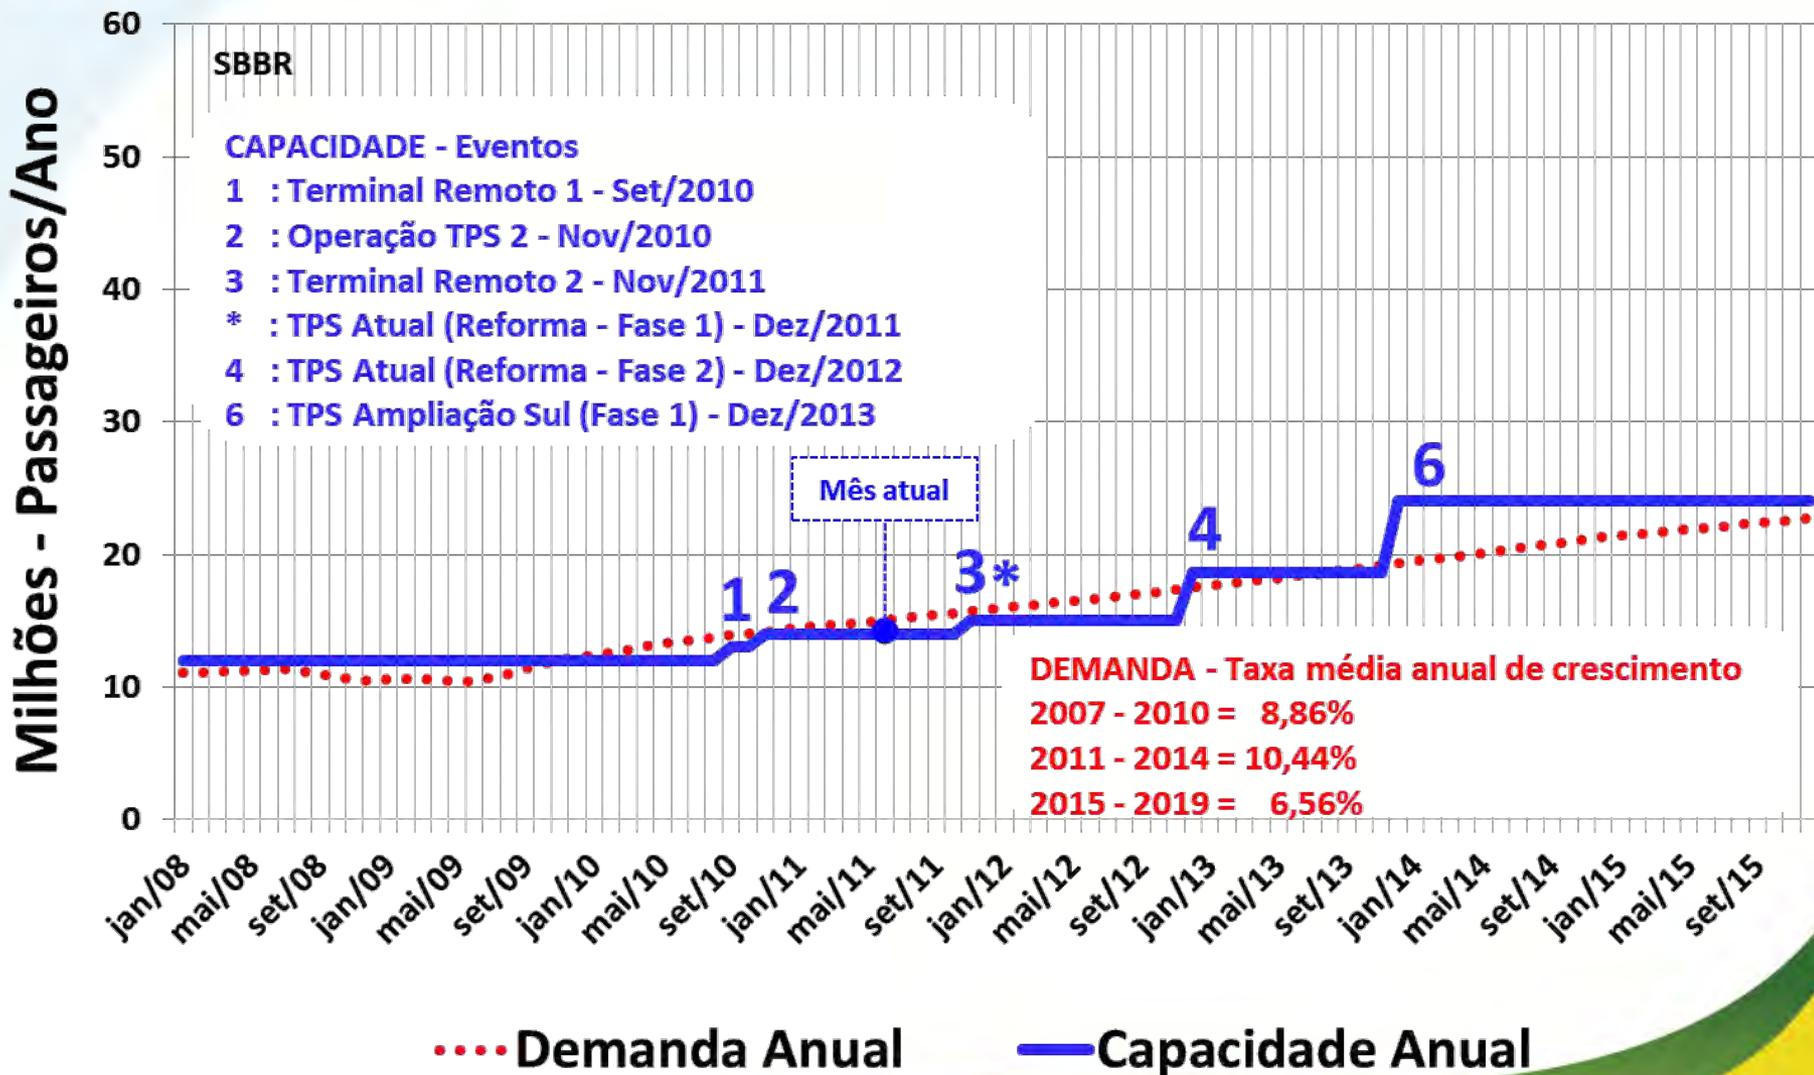

Brasília



Valor Total Previsto dos Investimentos: 748,40 milhões

1 Terminal Retoma 1 – em operação

Área: 1.200m² Capacidade: 1 milhão de pax/ano
Concluído em 30/set/2010

2 OPERAÇÃO TPS 2

Capacidade: 1 milhão pax/ano
Iniciado em 30/nov/2010

3 Terminal Remoto 2

Área: 1.500m² Capacidade: 1 milhão de pax/ano

Licença ambiental: 08/jul/2011

Pregão

Projeto básico: concluído em 25/mai/2011

Publicar aviso de licitação: 10/jun/2011

Data da contratação da empresa vencedora: 07/jul/2011

Previsão do início da obra: 15/jul/2011

Prazo de conclusão da obra: 30/nov/2011

* 4 TPS ATUAL - REFORMA

Licença ambiental: dispensada para reforma interna

* TPS Atual (Fase 1): Reforma de sanitários, construção de rampa central, instalação de um elevador e remanejamento de esquadrias no satélite e corpo central
Iniciado em 29/abr/2011 fim: 29/dez/2011

4-Demais ações: Reforma interna com ampliação de capacidade. Transformação da área comercial (corpo central) em área de embarque (2.245m²).

Capacidade: 3,6 milhões pax/ano

Obra: publicar edital: 30/jul/2011

Início: 15/dez/2011 fim: 15/dez/2012

7 PÓS 2014

TPS - Fase 2 Área: 80.000m²

PÁTIO - Fase 2 Área: 74.000m²

5 PÁTIO DE AERONAVES (Fase 1)

Área: 222.000m² - construção do pátio

Licença ambiental: 30/06/2011

Projeto básico: em execução - fim: 30/jun/2011

Obra: publicar edital: 30/jul/2011

Início: 06/nov/2011 - fim: 28/nov/2013

6 TPS AMPLIAÇÃO SUL (Fase 1)

Área: 80.000m²

Capacidade: 17 milhões pax/ano

Licença ambiental: em andamento - fim: 30/jun/2011

Projeto básico: em execução - fim: 30/jun/2011

Obra: publicar edital em 30/jul/2011


Início: 15/dez/2011 - fim: 10/dez/2013

Concessão

* As fases licitar, iniciar e finalizar da obra poderão ser antecipadas em função do projeto de concessão ora em análise.

CAMPINAS

CAMPINAS

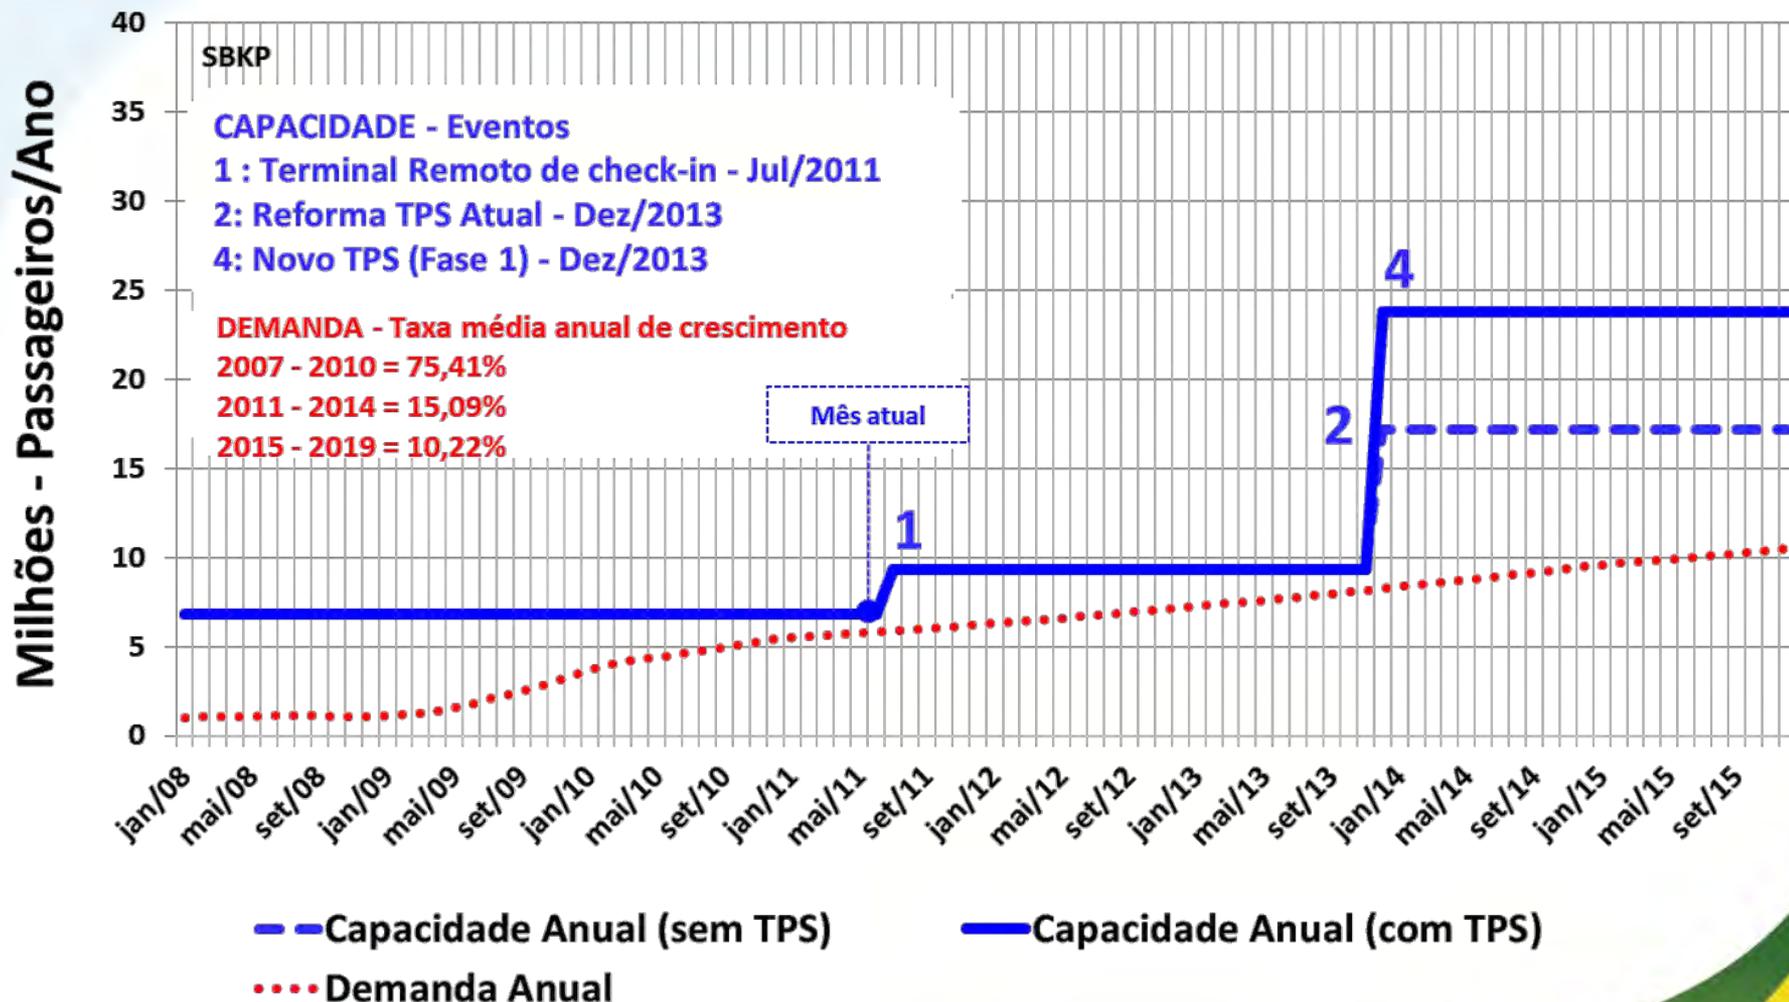


Campinas



Valor Total Previsto dos Investimentos: 796,75 milhões

Campinas

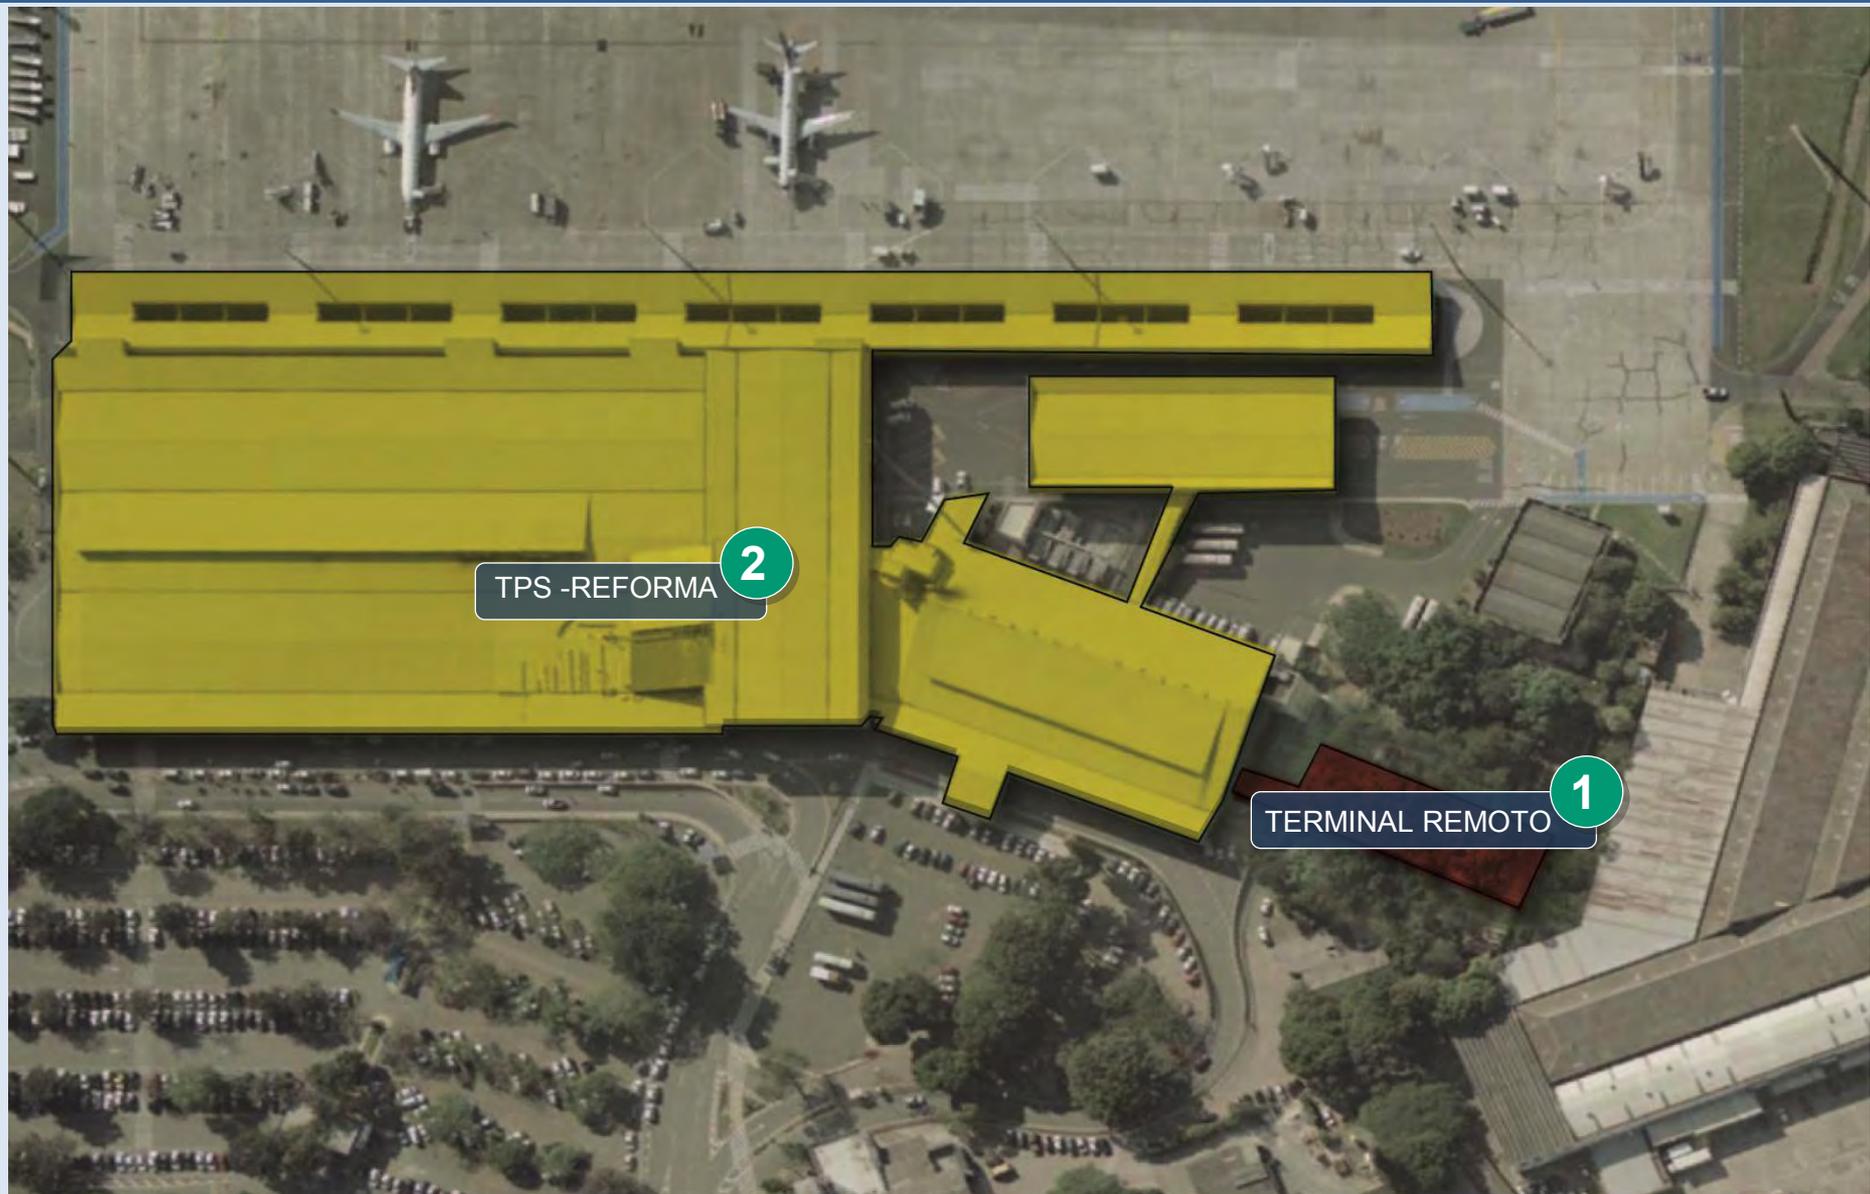

Campinas

1 Terminal Remoto

Área: 1.719 m² Capacidade: 2,5 milhões de pax/ano
Licença ambiental: concluída
Obra: fim: 30/jul/2011

2 Obra de adequação TPS atual

Capacidade: 7,9 milhões de pax/ano
Licença ambiental: concluída
Projetos: contratar em 01/jul/2011
Projeto básico: início: 05/jul/2011 - fim: 31/dez/2011
Obra: publicar edital: 15/fev/2012
Início: 01/ago/2012 - Fim: 31/dez/2013

3 Pátio de Aeronaves (Fase 1)

Área: 378.545 m²
Projetos: contratar em 29/jul/2011
Projeto básico: início: 19/ago/2011 - fim: 13/abr/2012
Obra terraplenagem: publicar edital: 16/mai/2012
Início: 01/out/2012 - fim: 20/abr/2013

4 Terminal de Passageiros (Fase 1)

Área : 68.443 m²
Capacidade: 6,6 milhões pax/ano
Projetos: contratar 29/jul/2011
Projeto básico: início: 19/ago/2011
fim: 13/nov/2012
Obra : publicar edital: 30/ago/2012
Início: 15/fev/2013 - fim: 30/dez/2013


Concessão administrativa
As fases licitar, iniciar e concluir da obra, serão alteradas em função do projeto de concessão ora em análise.

5 PÓS 2014

TPS - Fase 2 Área: 191.560m²
Pátio - Fase 2 Área: 378.545m²

GALEÃO

GALEÃO

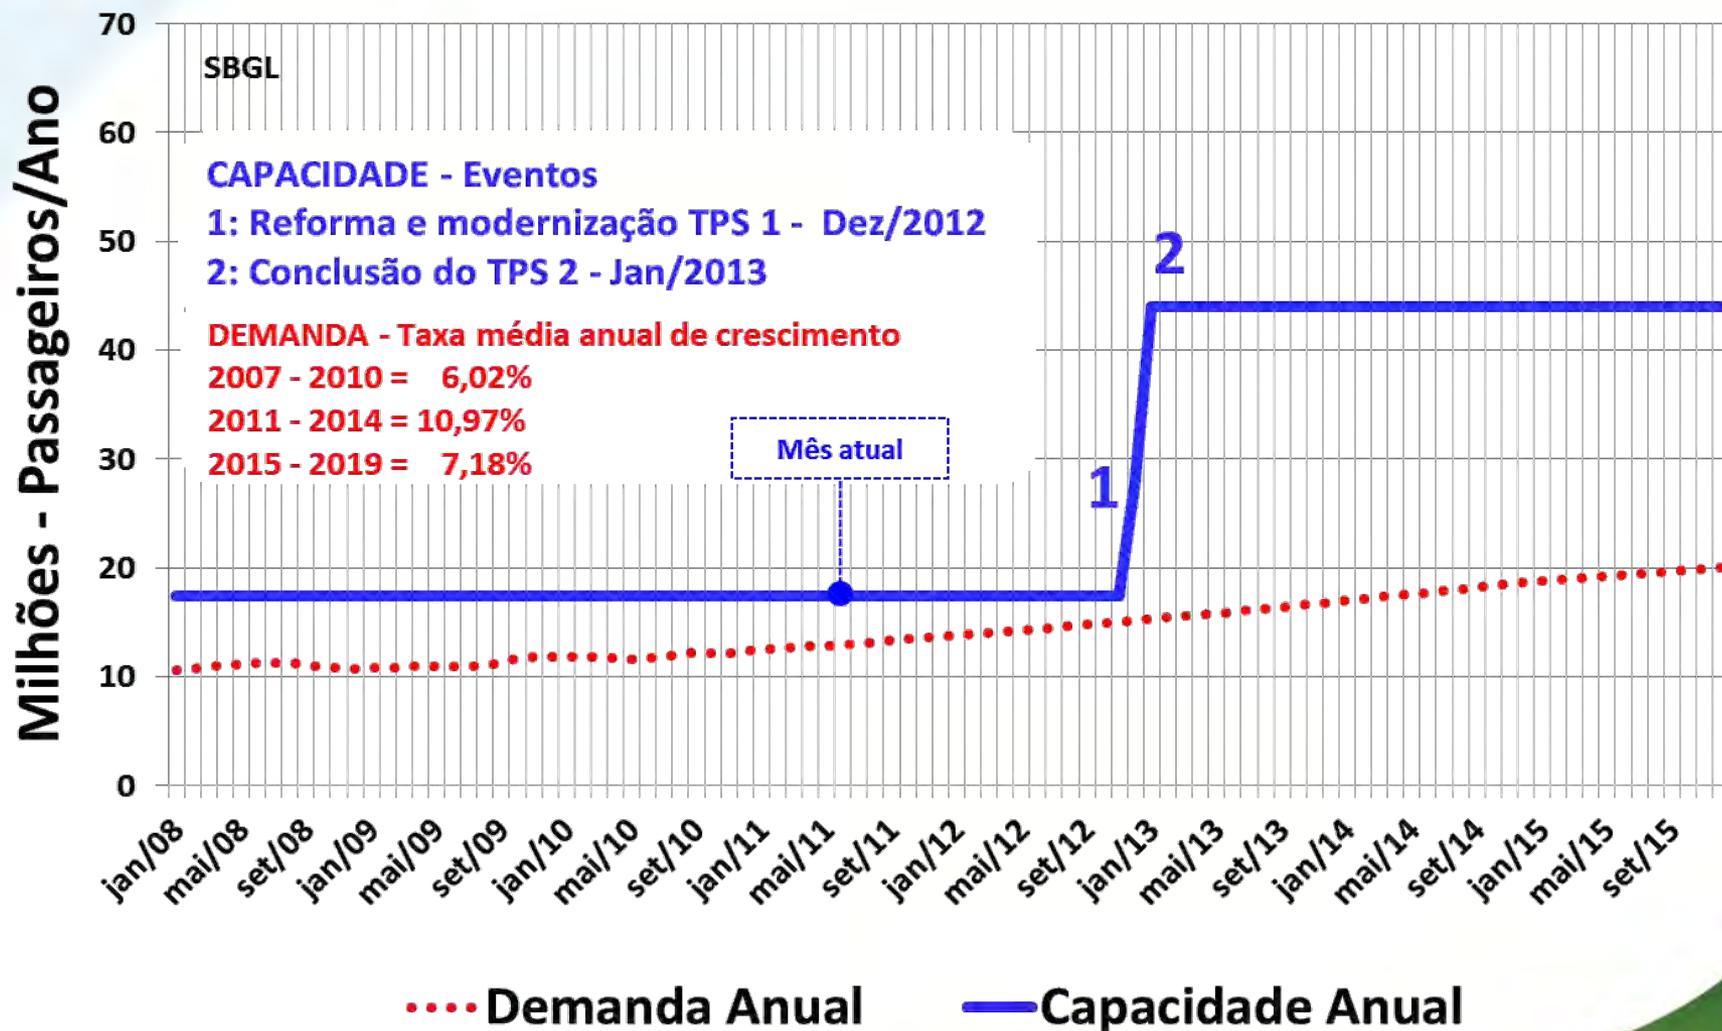

Galeão



Valor Total Previsto dos Investimentos: 657,47 milhões

1 Revitalização do TPS 1

Licença ambiental: concluída

Obras emergenciais (14 lotes - 11 concluídos)

1) Obras civis e substituição dos elevadores iniciadas em 13/abr/2009 - fim: 02/ago/2011

2) Revitalização da sinalização do TPS
Obra: edital publicado em: 10/mai/2011
Início: 22/jul/2011 - fim: 03/abr/2012

3) Escadas rolantes: 44 substituídas
Pregão: abertura em 01/mar/2011
Início: 12/jul/2011 - fim: 01/jul/2013

Obras estruturais
Projeto básico: concluído
Obra: publicar edital: 22/jun/2011
Início: 15/dez/2011 - fim: 15/dez/2012

2 Conclusão TPS 2

Aumento de 46.522m²

Capacidade: 15,9 milhões pax/ano

Licença ambiental: concluída

Projeto básico: concluído

Obra: em execução - fim: 01/jan/2013

Escadas rolantes: 12 novas e 2 substituídas


Pregão: abertura em 01/mar/2011

Contratar até 14/jun/2011

Início: 12/jul/2011 - fim: 01/jul/2013

CONFINS

CONFINS

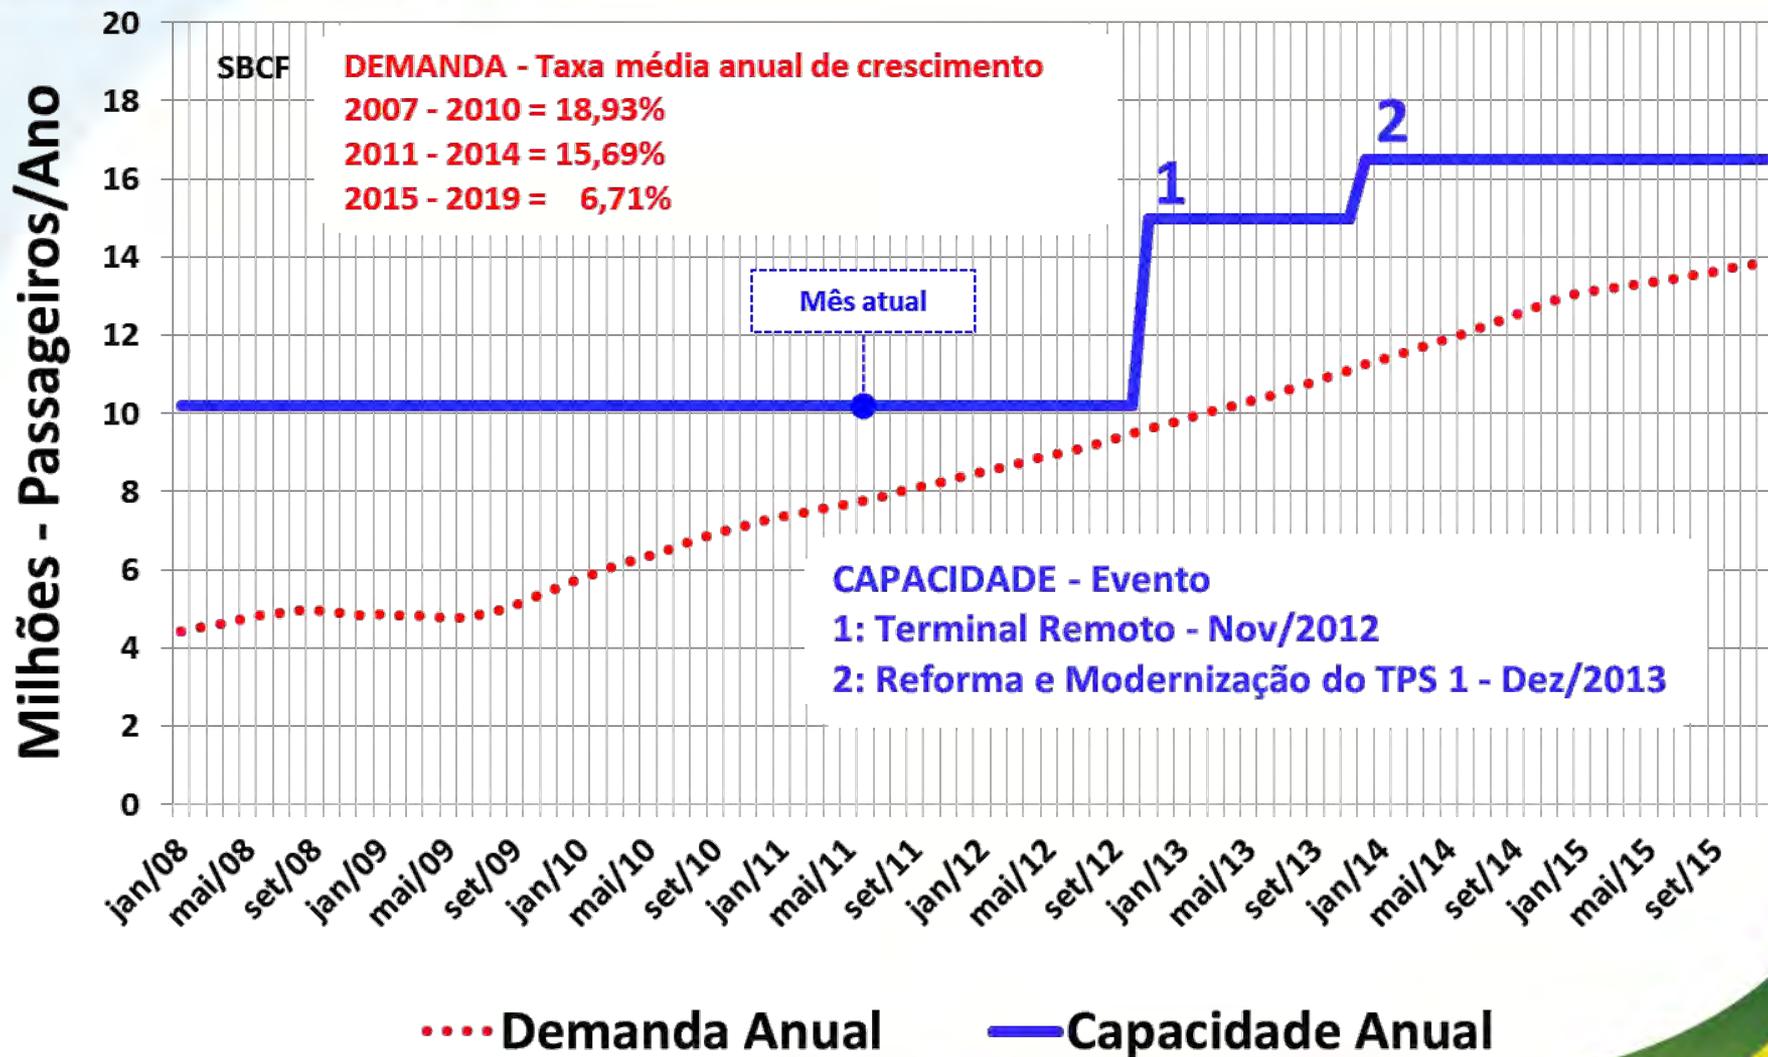

Confines



Valor Total Previsto dos Investimentos: 406,80 milhões

1 Reforma TPS

Aumento de 7.370m² Capacidade: 1,6 milhões pax/ano
Licença ambiental: dispensada em 10/nov/2010
Projeto básico: concluído
Obra: publicado edital em 18/mar/2011
Início: 21/out/2011 - fim: 31/dez/2013

2 Terminal Remoto

Capacidade: 4,8 milhões pax/ano
Fim: Nov/2012

3 Ampliação Taxi

Licença ambiental: em andamento
Projetos: contratados - início: 12/jul/2011 - fim:
06/jan/2012
Obra: publicar edital: 23/mar/2012
Início: 21/set/2012 - fim: 30/dez/2013

4 Ampliação Pátio de Aeronaves


Aumento: 192.400m²
Licença ambiental: em andamento
Projetos contratados
Projeto básico: início: 12/jul/2011 - fim:
06/jan/2012
Obra: publicar edital: 23/mar/2012
Início: 21/set/2012 - fim: 30/dez/2013

5 Ampliação Pista - 600m

Licença ambiental: em andamento
Projetos: contratados. Início: 12/jul/2011 - fim:
06/jan/2012
Obra: publicar edital: 23/mar/2012
Início: 21/set/2012 - fim: 30/dez/2013

CURITIBA

CURITIBA

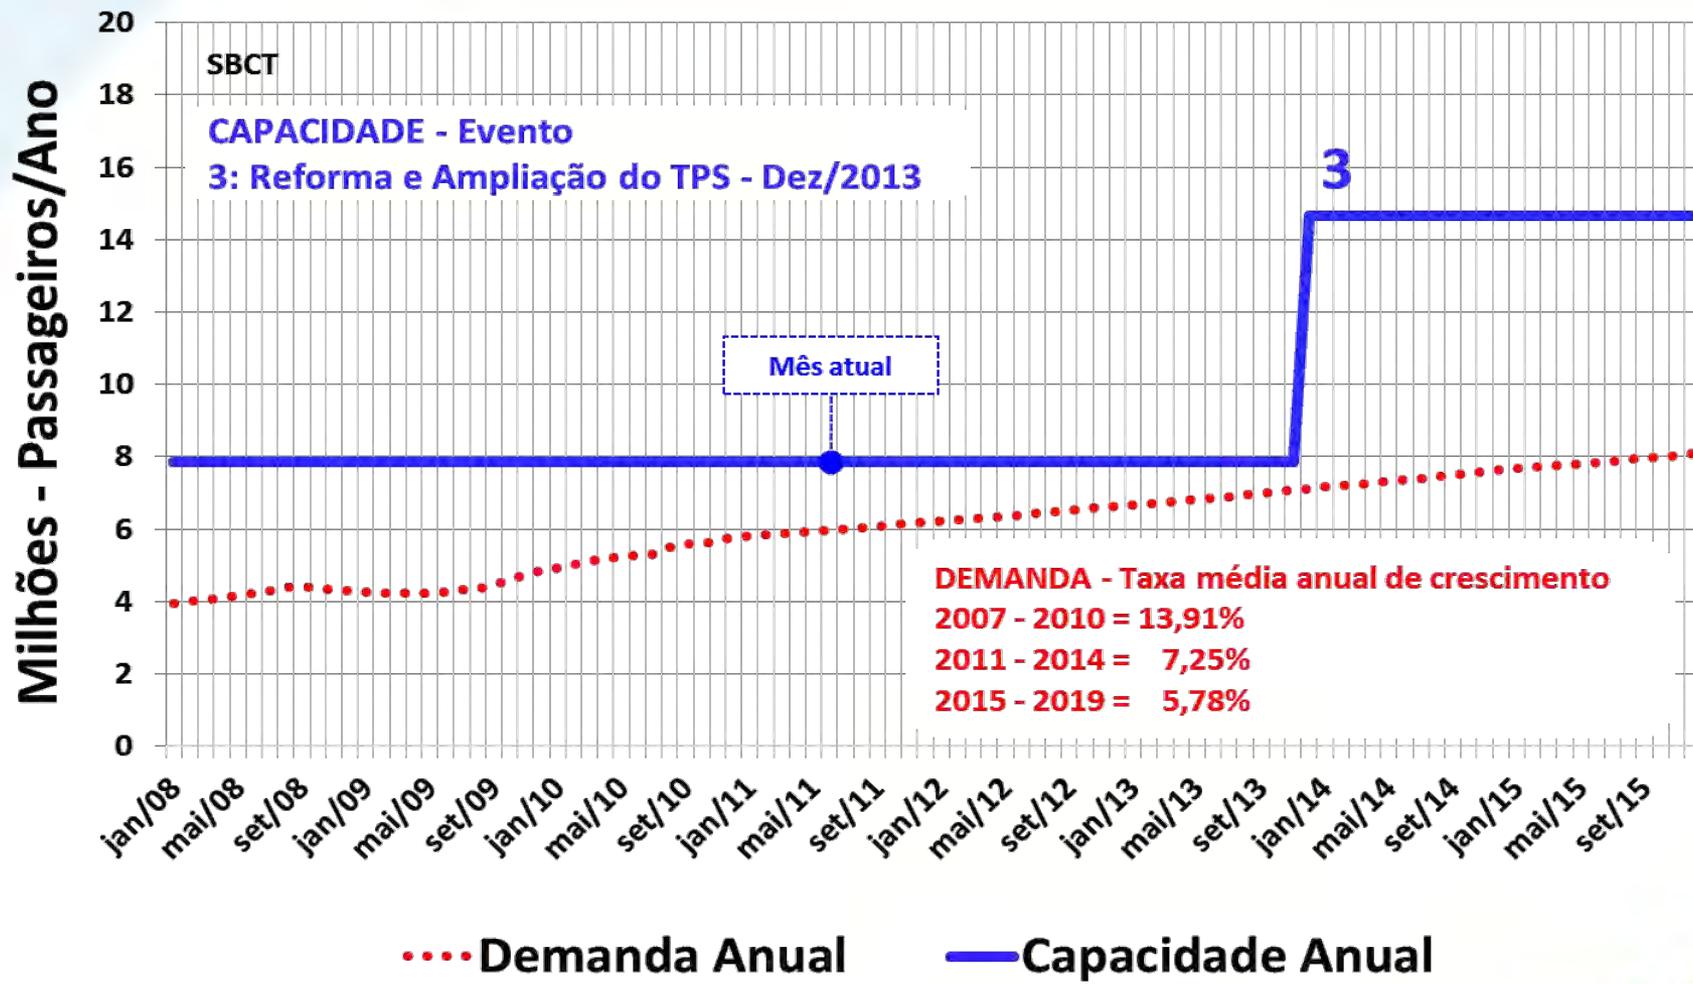

Curitiba



Valor Total Previsto dos Investimentos: 101,99 milhões

Curitiba

1 Ampliação Pátio

Aumento: 59.879m²

Licença ambiental: concluída

Projetos: concluídos

Obra: publicado edital em 20/jan/2011

Obra: contratada em 25/mai/2011

Início: 15/jun/2011 - fim: 29/fev/2012

3 Ampliação TPS

Aumento: 17.445m² Capacidade: 6,8 milhões pax/ano

Licença ambiental: concluir renovação em 30/nov/2011

Projeto básico: iniciado em 30/mai/2011 - fim: 29/nov/2011

Obra: publicar edital: 15/dez/2011

Início: 29/jun/2012 - fim: 27/dez/2013

2 Ampliação Taxi

Aumento: 947m

Licença ambiental: concluída

Projetos: concluídos

Obra: publicar edital: 01/ago/2011

Início: 15/jan/2012 - fim: 14/abr/2013

4 CAB 33

Instalação do ILS CAT II

Iniciada em mar/2011 e concluída em mai/2011

Operação iniciar até jul/2011


5 CAB 15

Instalação do ILS CAT III

Em estudo por GT formado pelo
DECEA/ANAC/Infraero

SALVADOR

SALVADOR

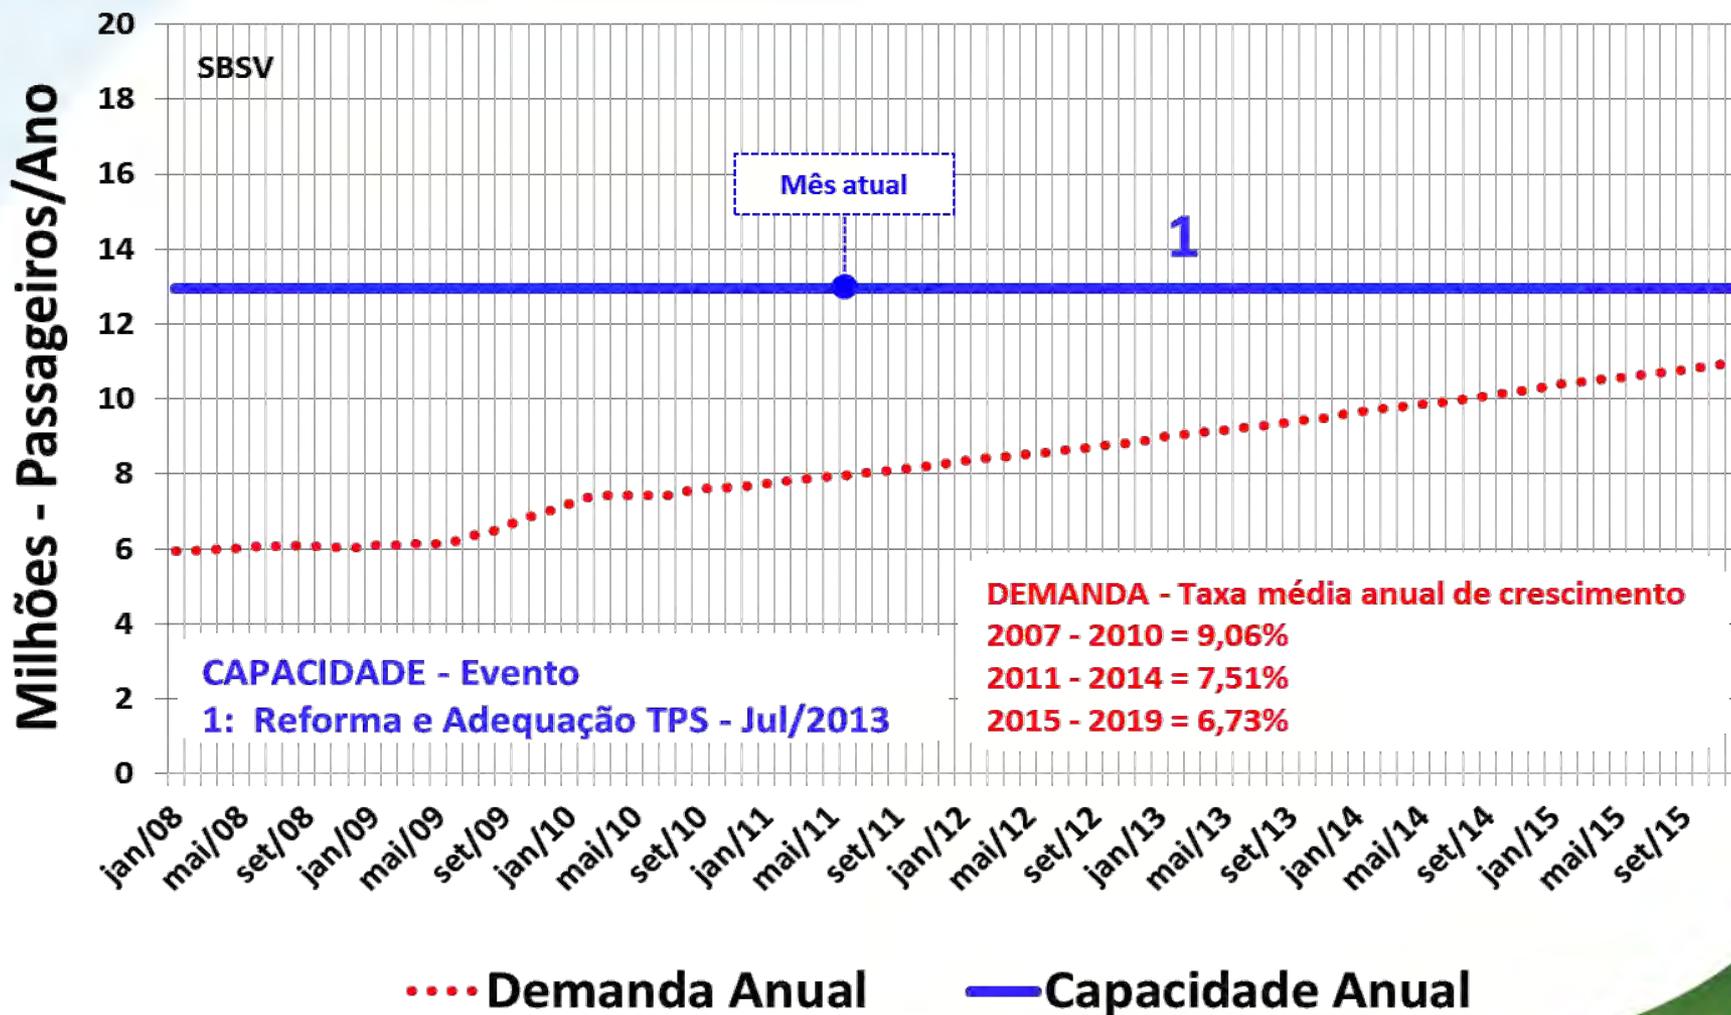

Salvador



Valor Total Previsto dos Investimentos: 47,61 milhões

1 TORRE DE CONTROLE

Área (torre + pavimento técnico) 440m²

Licença ambiental: em andamento

Projetos: concluídos

Obra: publicar edital: 15/jun/2011

Obra: início: 28/nov/2011 fim: 15/dez/2012

Instalação dos equipamentos (DECEA): prazo de execução após conclusão da obra: 2 meses

2 PÁTIO DE AERONAVES

Aumento: 11.750m²

Licença ambiental: em andamento

Projetos: contratados

Projeto básico: iniciado em 19/abr/2011 - fim: 15/out/2011

Obra : publicar edital: 02/dez/2011

Início: 22/mai/2012 - fim: 17/mai/2013

3 TPS ATUAL - REFORMA

Licença ambiental: em andamento

Projetos: contratados


Projeto básico: iniciado em 19/abr/2011 - fim: 15/dez/2011

Obra: publicar edital: 02/fev/2012

Início: 22/jul/2012 - fim: 17/jul/2013

FORTALEZA

FORTALEZA

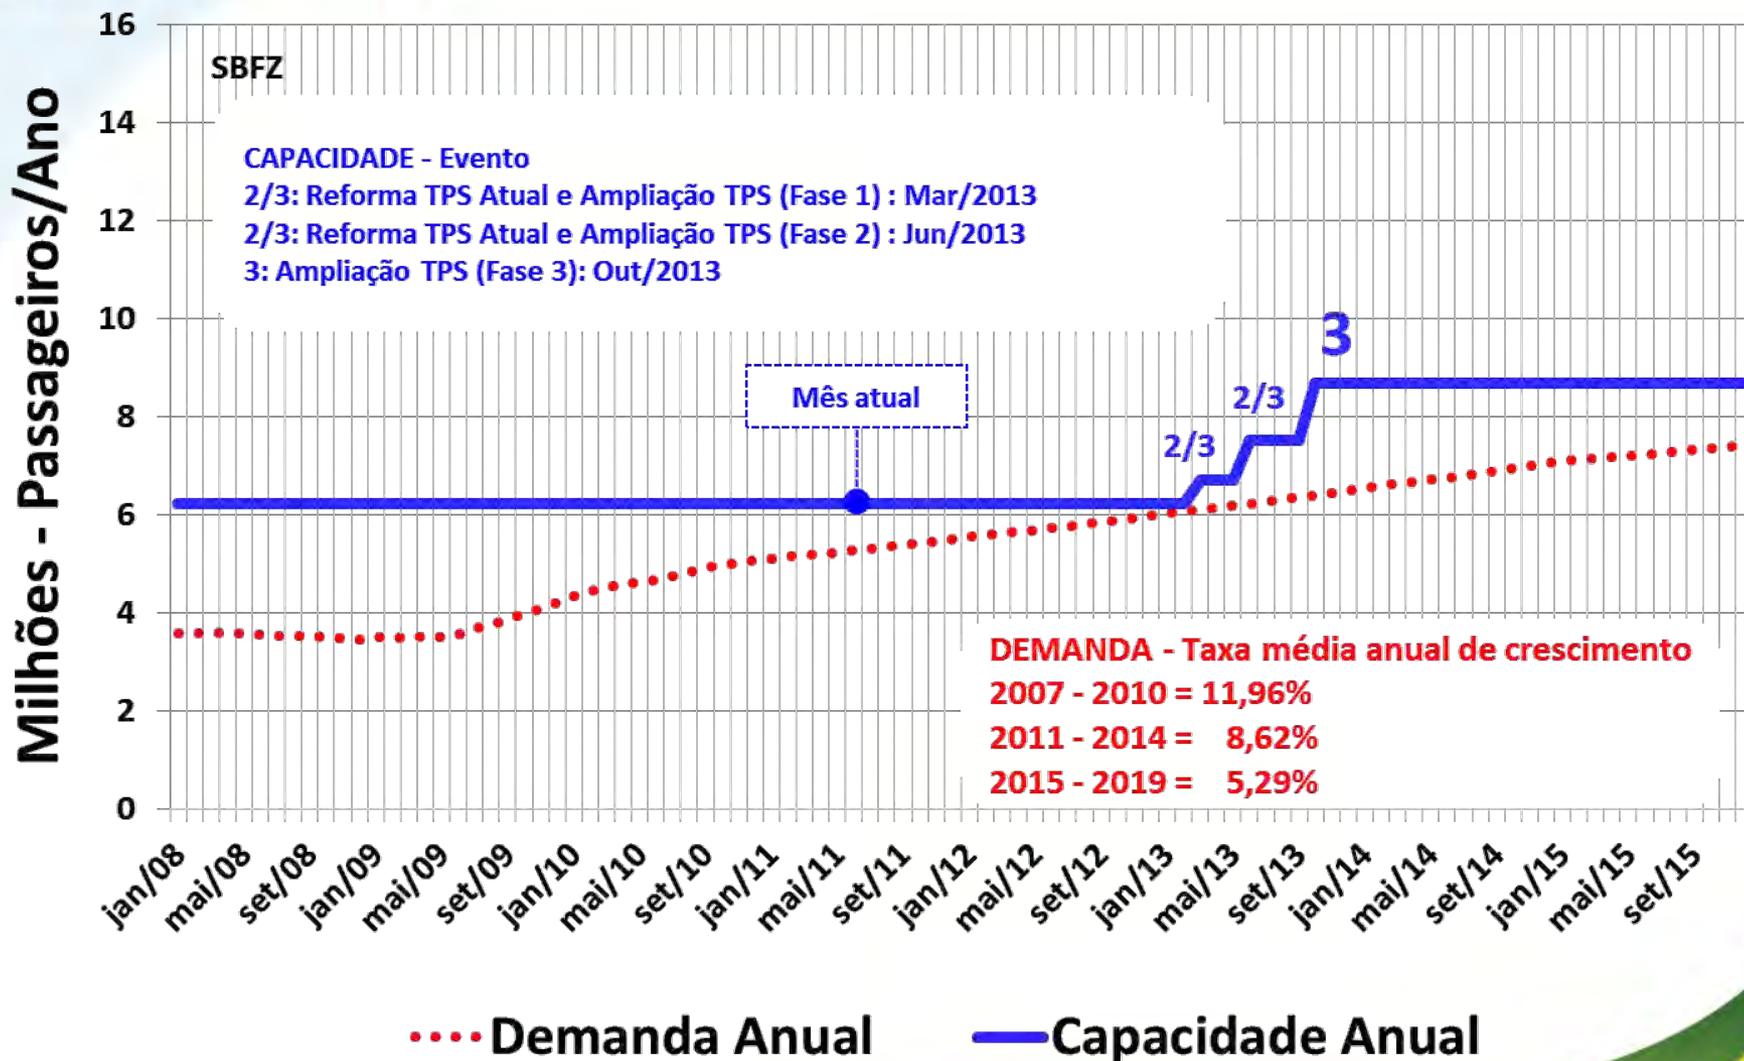

Fortaleza



Valor Total Previsto dos Investimentos: 349,71 milhões

Fortaleza

1 PÁTIO DE AERONAVES - AMPLIAÇÃO

Aumento: 38.000m²
Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: concluído em 30/mai/2011
Obra: publicar edital: 15/jun/2011
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013

2 TPS ATUAL - REFORMA (Fase 1)

Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: concluído em 30/mai/2011
Obra: publicar edital: 15/jun/2011
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013

3 TPS - AMPLIAÇÃO (Fase 1)


Aumento de 27.939m² Capacidade: 2,4 milhões de pax/ano
Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: concluído em 30/mai/2011
Obra: publicar edital: 15/jun/2011
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013

4 PÓS 2014

Reforma - Fase 2
Área de 30.030m²

Ampliação - Fase 2
Área de 33.365m²

CUIABÁ

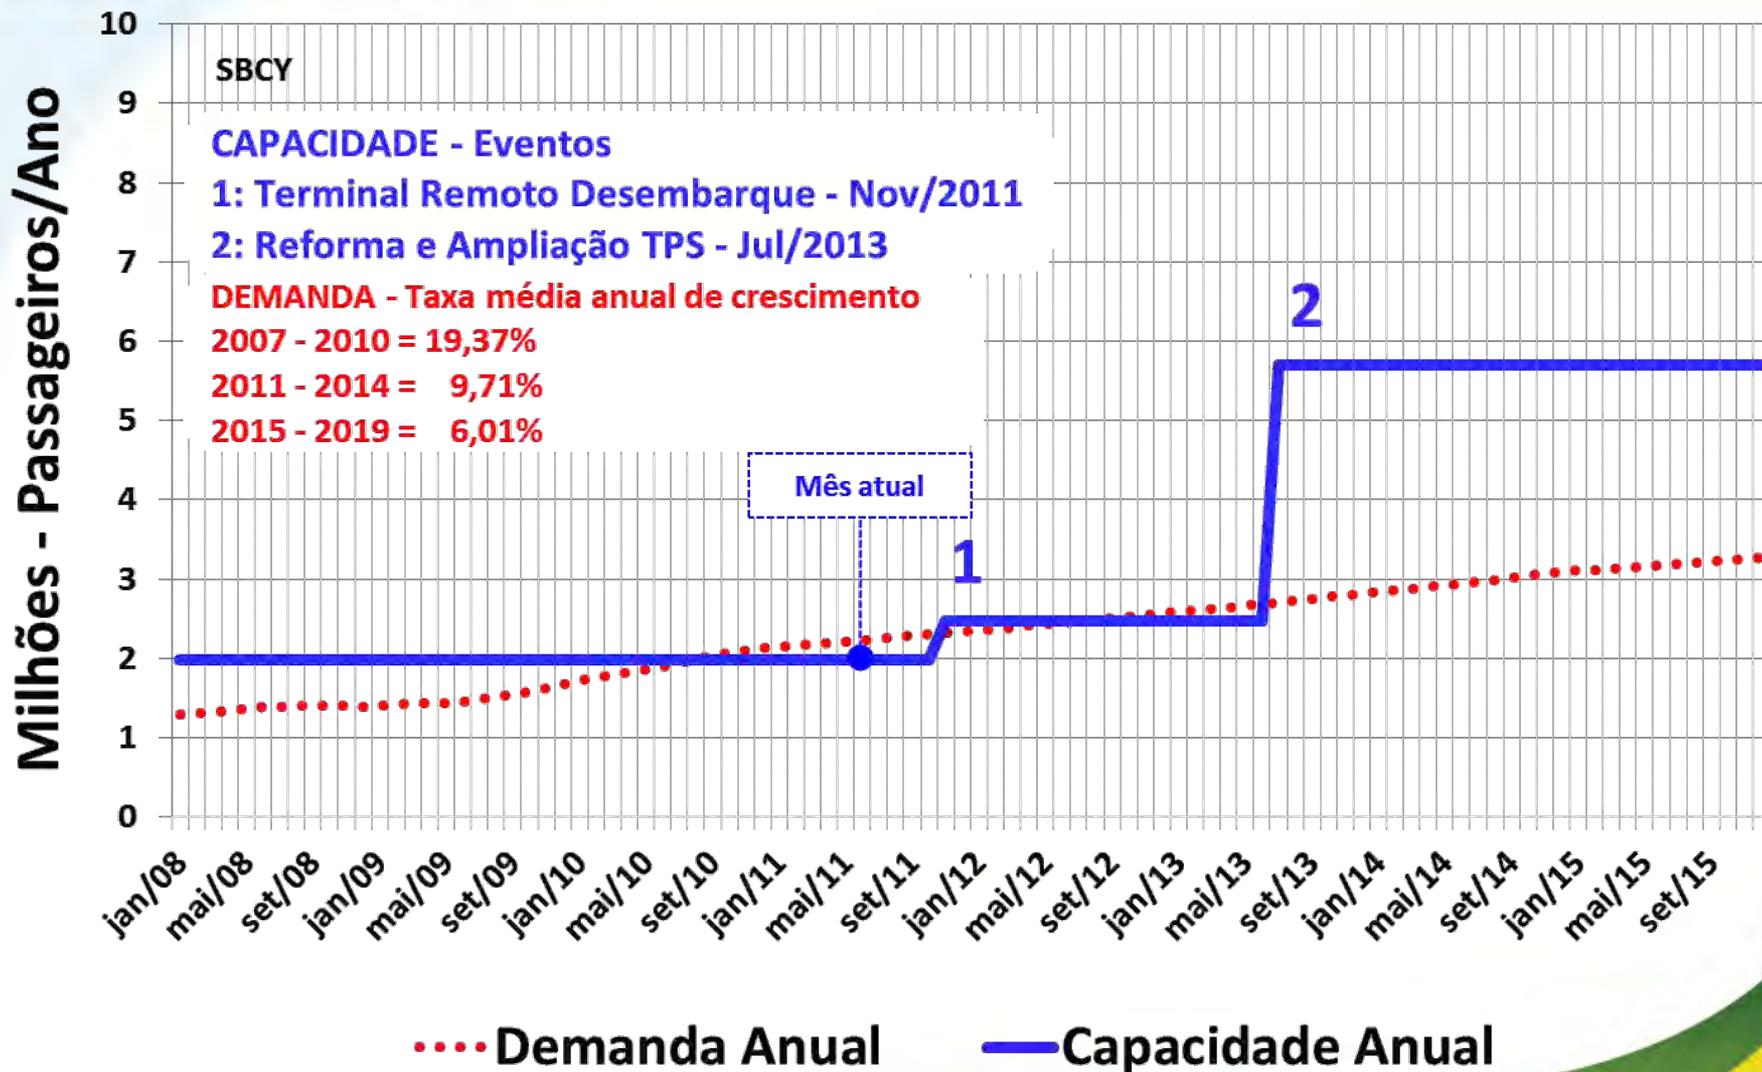

Cuiabá



Valor Total Previsto dos Investimentos: 88,43 milhões

1 TERMINAL REMOTO - DESEMBARQUE


Área: 675 m² Capacidade: 800.000 pax/ano
Contratado em 30/mai/2011
Início: 10/jun/2011 - fim: 03/nov/2011

2 TPS - REFORMA E AMPLIAÇÃO

Aumento de 7.740m² Capacidade: 4,3 milhões pax/ano
Licença ambiental: concluída
Projeto básico: iniciado em 24/jan/2011 - fim: 20/set/2011 -
Obra: publicar edital: 30/out/2011
Início: 16/mar/2012 - fim: 31/jul/2013

MANAUS

MANAUS

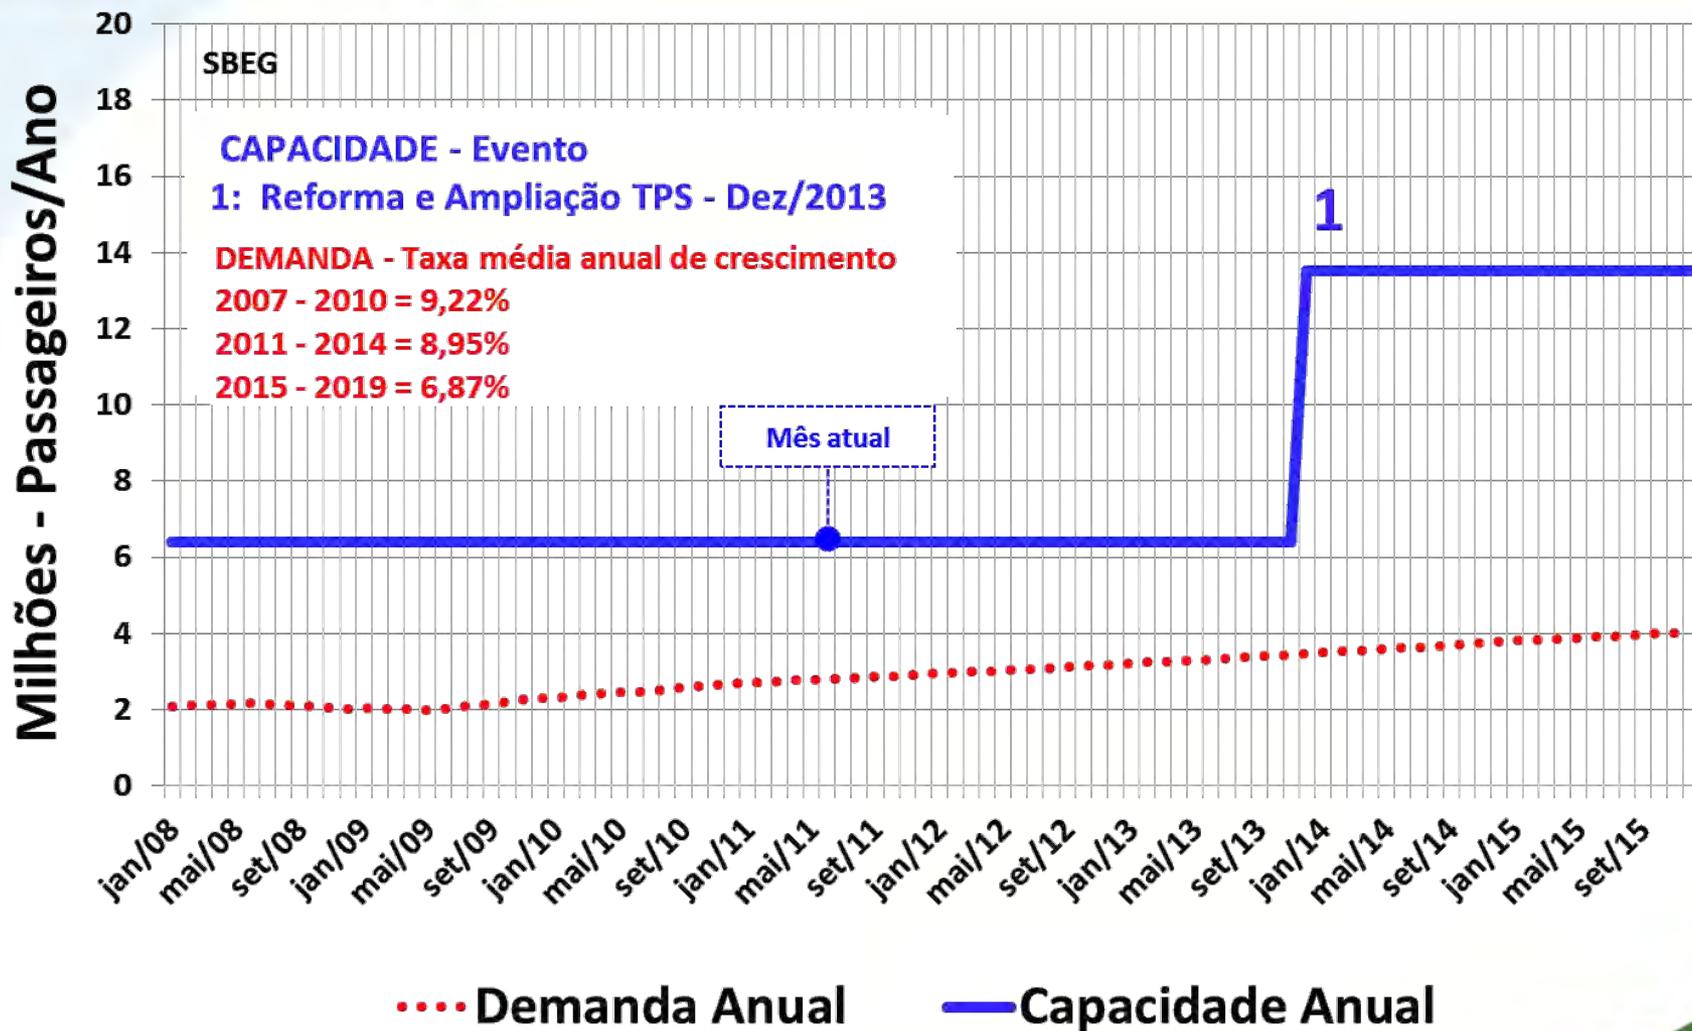

Manaus



Valor Total Previsto dos Investimentos: 415 milhões

1

TPS - REFORMA E AMPLIAÇÃO (Fase 1)

Aumento: 37.000m² Capacidade: 7,1 milhões de pax/ano

Licença ambiental: em andamento

Projeto básico: concluído


Audiência pública realizada em 25/abr/2011

Obra: edital publicado em 25/mai/2011


Início: 28/nov/2011 - fim: 20/dez/2013

PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE

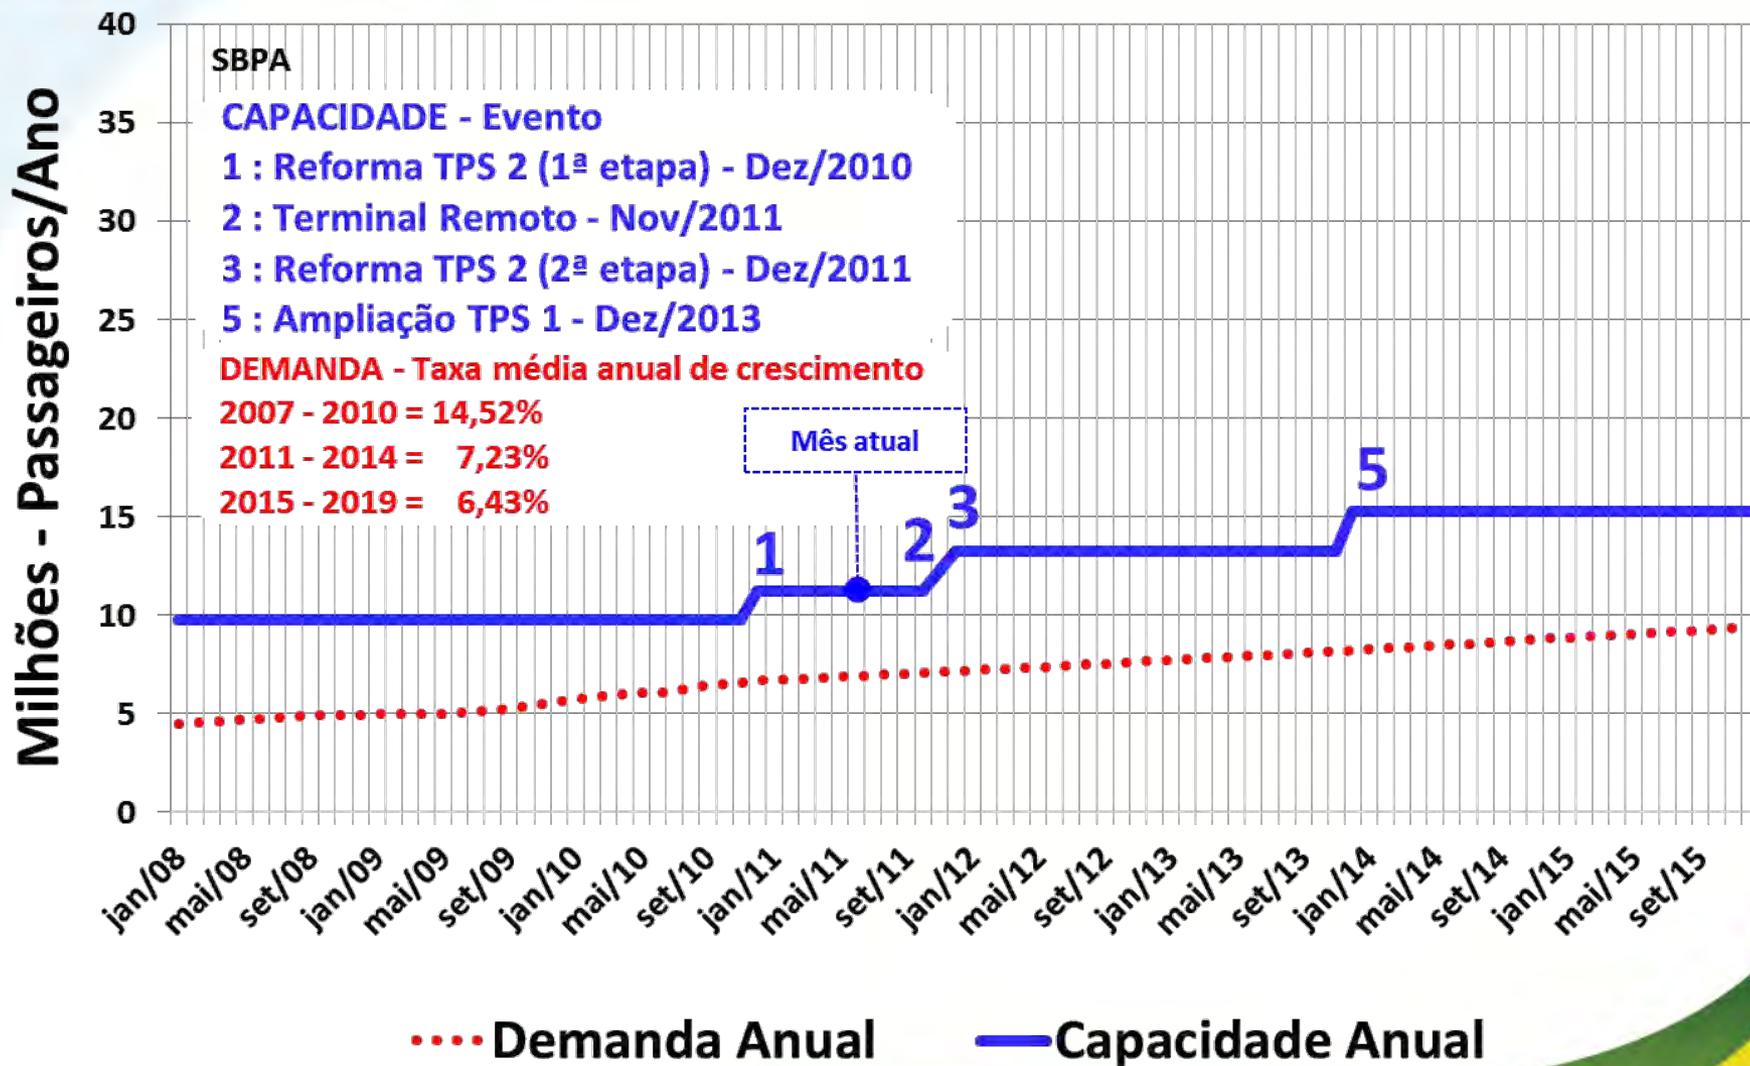

Porto Alegre

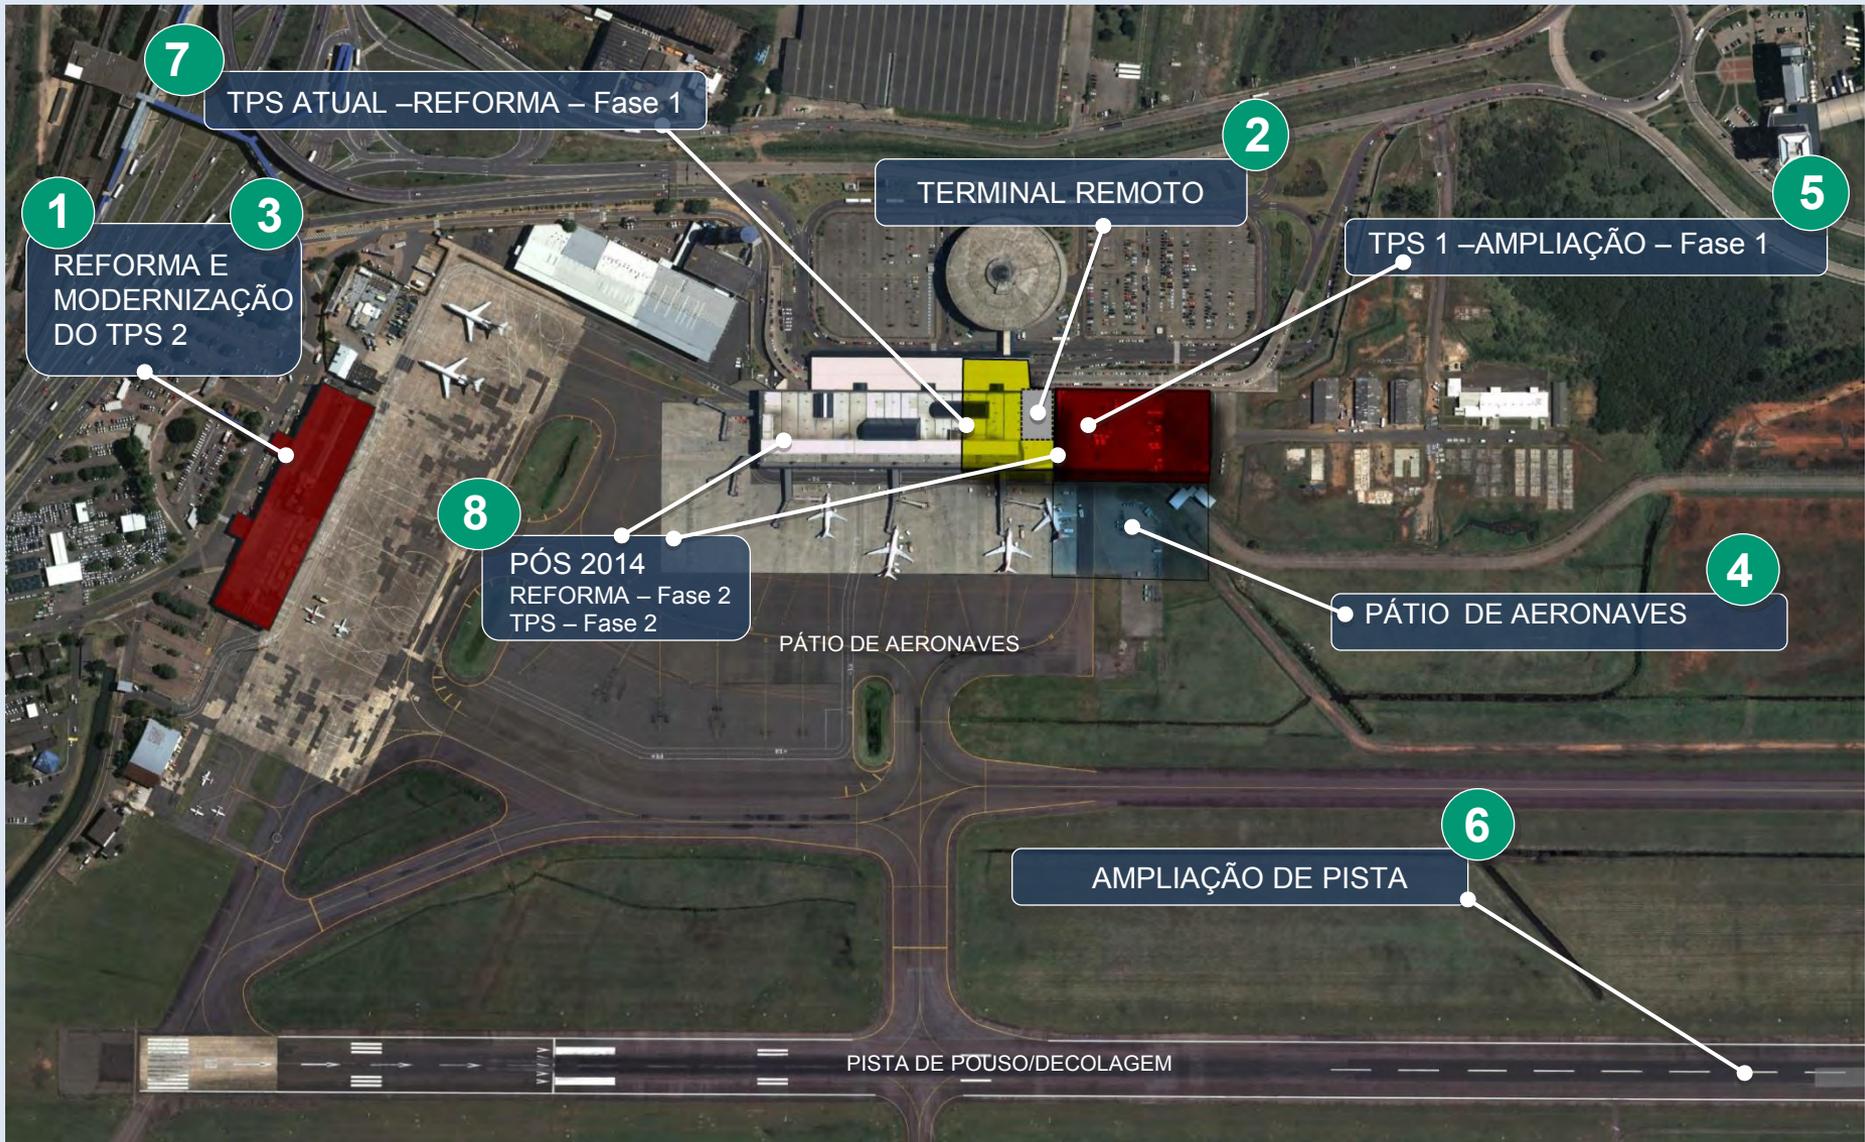

Valor Total Previsto dos Investimentos: 569 milhões

Porto Alegre

1

3

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO TPS 2

1- (1ª Etapa)

Capacidade: 1,5 milhão pax/ano
Concluído em 15/dez/2010

3- (2ª Etapa)

Capacidade: 1 milhão pax/ano
Fim: 23/dez/2011

2

TERMINAL REMOTO

Área: 1.460 m² Capacidade: 1,2 milhão pax/ano
Contratado em 29/abr/2011
Obra: iniciada em 10/mai/2011 - fim: 30/nov/2011

4

PÁTIO DE AERONAVES

Aumento: 38.020 m²
Licença ambiental: concluída
Projetos: propostas abertas em 29/abr/2011
Projeto básico - início: 15/ago/2011 fim: 06/abr/2012
Obra - publicar edital: 30/abr/2012
Início: 29/out/2012 - fim: 30/dez/2013

Porto Alegre

5 AMPLIAÇÃO TPS (Fase 1)

Aumento: 20.011 m² Capacidade: 3,4 milhões pax/ano
Licença ambiental: concluída
Projetos: propostas abertas em 29/abr/2011
Projeto básico - início: 15/ago/2011 - fim: 06/abr/2012
Obra: publicar edital: 30/abr/2012
Início: 29/out/2012 - Fim: 30/dez/2013

6 AMPLIAÇÃO DE PISTA

Aumento: 1.000m
Licença ambiental: concluída
Projetos básico e executivo: em adequação pelo Exército - fim:30/set/2011
Obra - publicar edital: 15/out/2011
Início: 28/fev/2012 - Fim: 19/nov/2013

7 REFORMA DO TPS (Fase 1)

Área de 11.280 m²
Início: 29/out/2012 - fim: 30/dez/2013
Projetos: propostas abertas em 29/abr/2011
Projeto básico - início: 15/ago/2011 - fim: 06/abr/2012
Obra: publicar edital: 30/abr/2012


8 PÓS 2014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TPS (Fase 2)

Reforma do TPS: 26.320m²
Totalizando área de reforma: 37.600m²

Ampliação do TPS: 46.693m²
Totalizando ampliação: 66.704m²

RECIFE

RECIFE

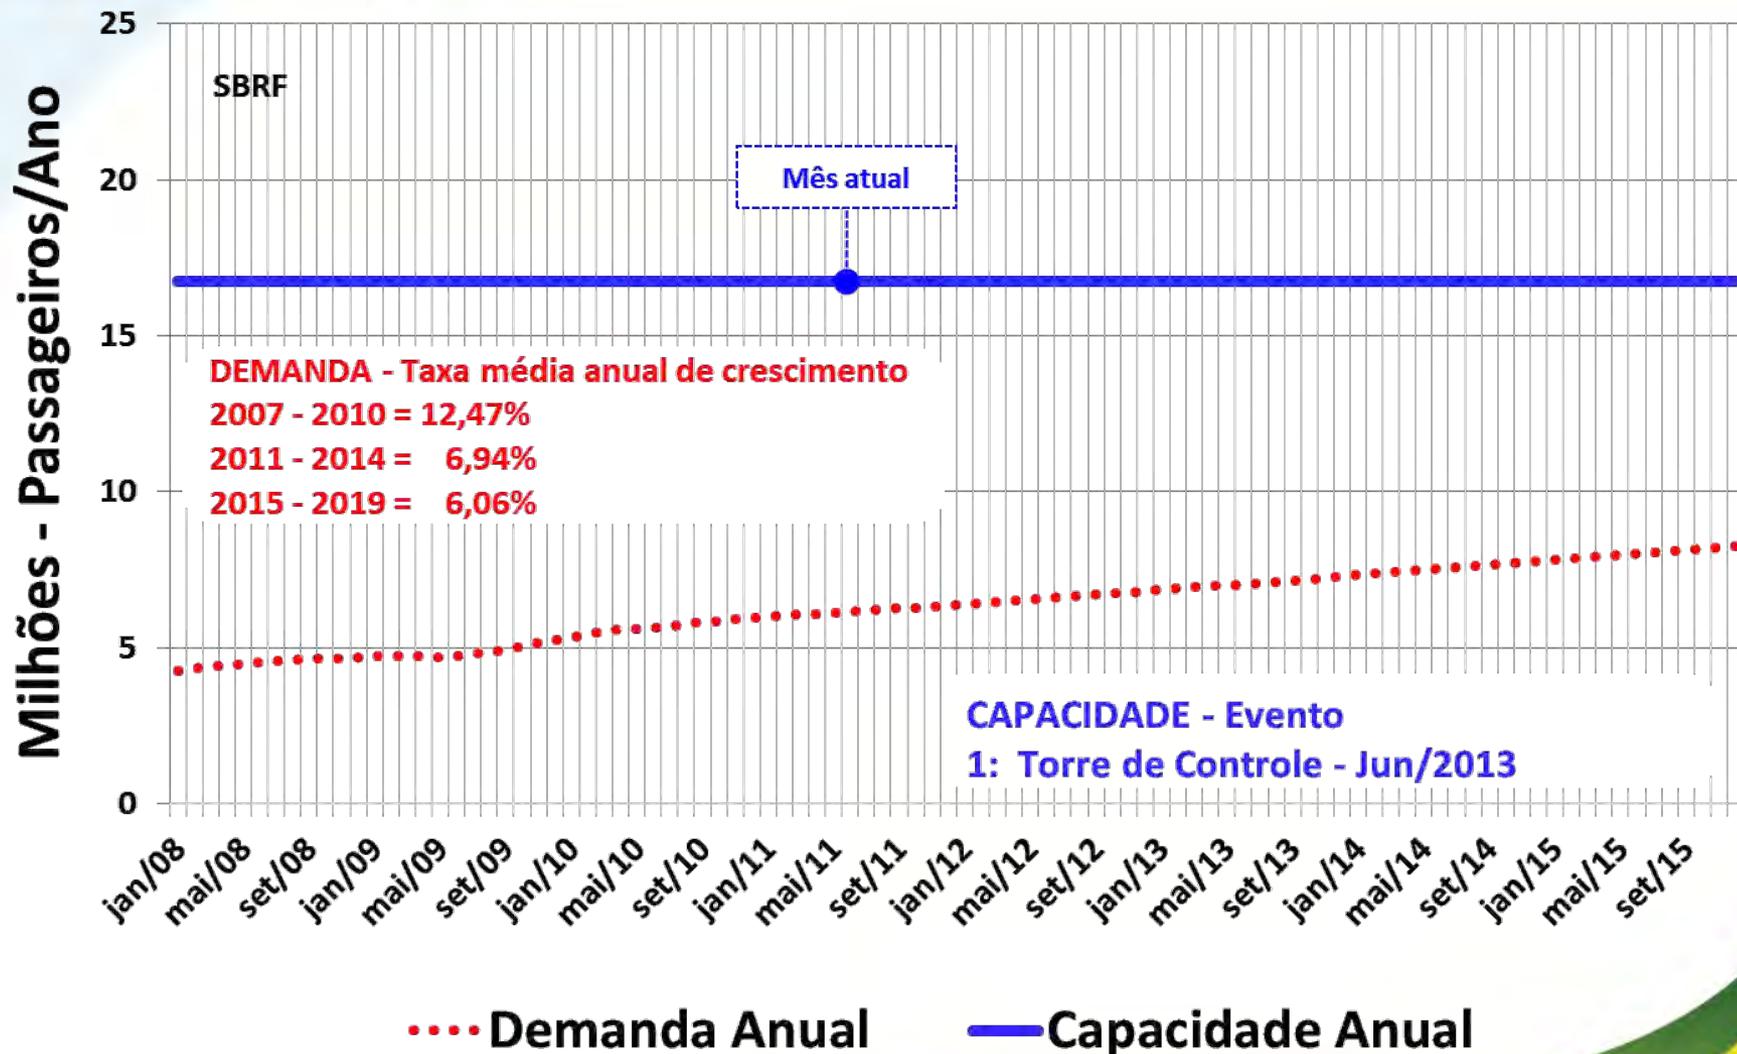

Recife



1

TORRE DE
CONTROLE

Pátio de Aeronaves

Pista de Pouso/Decolagem

Valor Total Previsto dos Investimentos: 18,47 milhões

1 TORRE DE CONTROLE

Área: Torre + pavimento técnico - 308m²

Licença ambiental - início: 30/jun/2011 - fim: 30/set/2011

Projetos: orçamentação em execução - fim: 25/jun/2011


Obra: publicar edital em 01/ago/2011

Início: 02/jan/2012 - fim: 01/jun/2013

Instalação dos equipamentos pelo DECEA: 30/set/2013

AUGUSTO SEVERO

AUGUSTO SEVERO

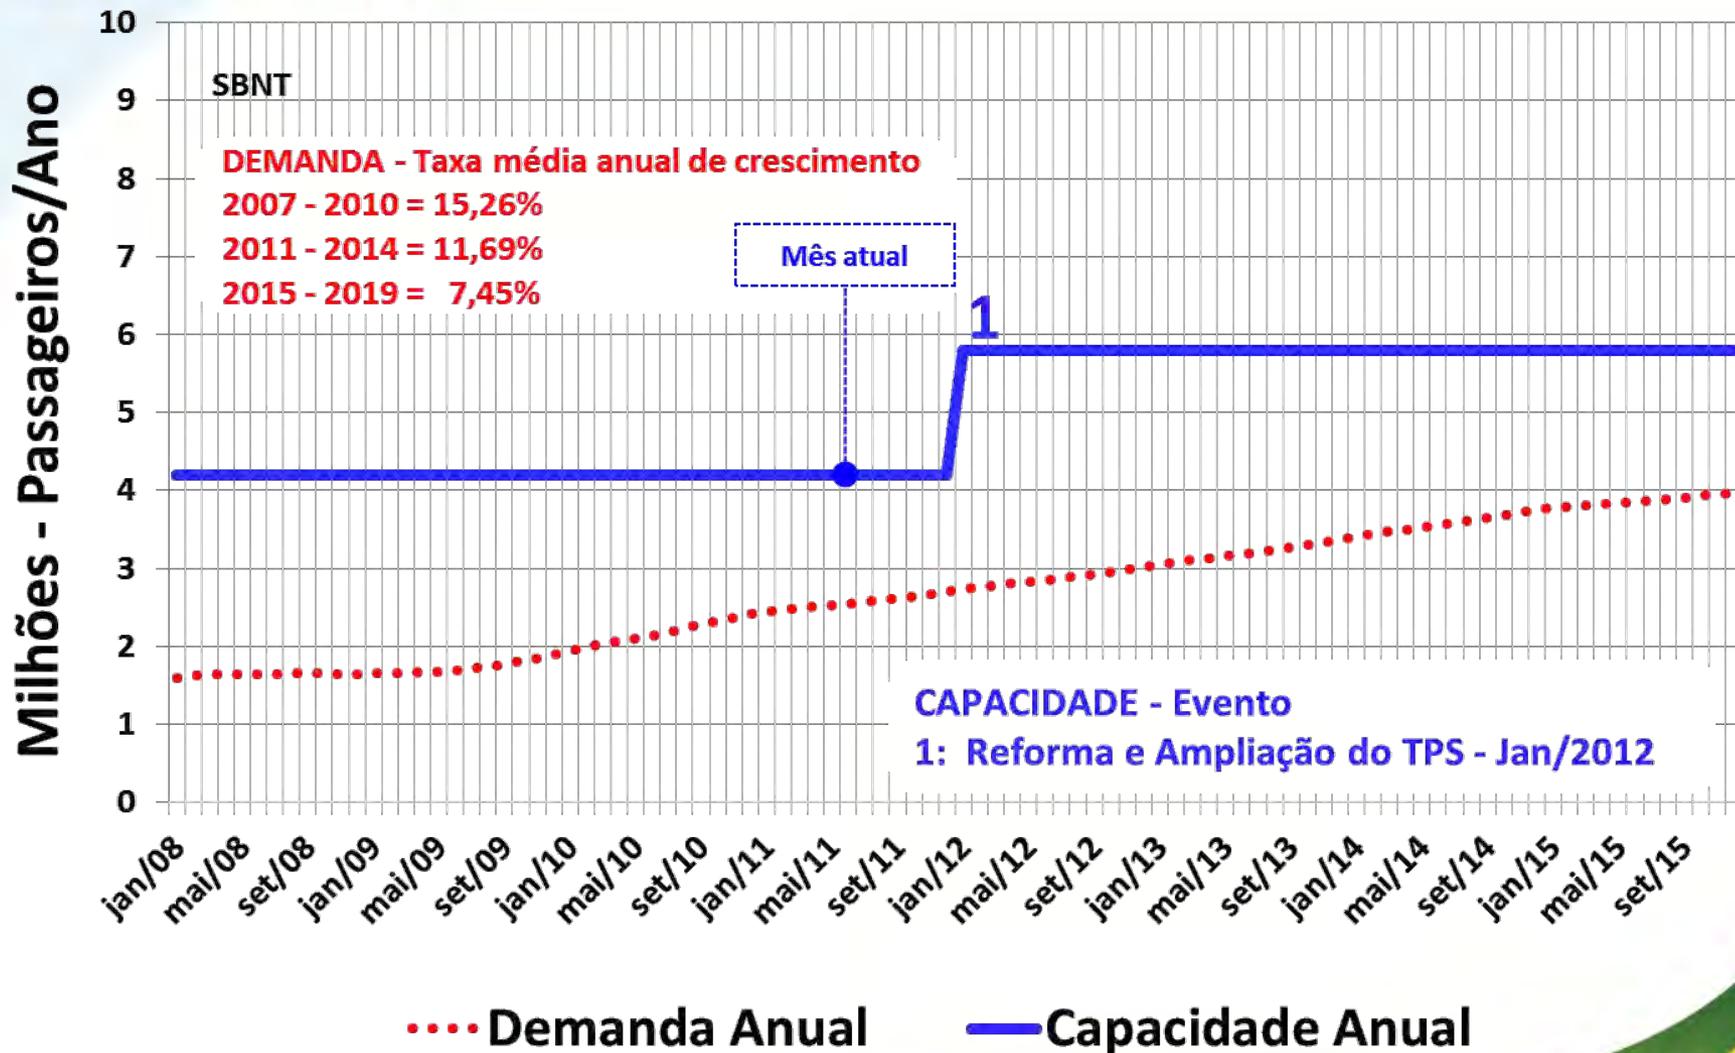

Augusto Severo



Valor Total Previsto dos Investimentos: 16,42 milhões

1

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TPS

Edital publicado em 04/02/2009

Projeto básico: concluído

Obra iniciada em 21/fev/2011 – em execução

Fim: 17/jan/2012
